

**Выполнение работ по благоустройству зоны отдыха
в районе домов 33,37 по ул. Мира в городе Оленегорске**

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в государственную программу Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области", утвержденную Постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденную постановлением Администрации г. Оленегорска от 22.10.2017 № 452 (в редакции постановлений Администрации города Оленегорска от 17.11.2017 № 485, от 28.03.2018 № 229, от 30.05.2018 № 345, от 21.09.2018 № 588, от 26.02.2019 № 90, от 21.03.2019 № 175, от 17.04.2019 № 228, от 11.10.2019 № 734, от 03.02.2020 № 102, от 06.05.2020 № 416, от 13.07.2020 № 567, от 25.09.2020 № 715, от 02.11.2020 № 804, от 19.11.2020 № 836, от 14.01.2021 № 7, от 12.02.2021 № 95, от 12.05.2021 № 332)

Общая стоимость работ – 3 045 608,98 (три миллиона сорок пять тысяч шестьсот восемь) рублей 98 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 2893328,53 рублей.

- бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сумме 152 280,45 рублей.

Заказчик – МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска.

Подрядчик – ООО «УК ГАРАНТ+»

Срок выполнения работ: с 01.05.2021 по 31.08.2021.

Проектно – сметной документацией предусмотрено:


- мощение дорожек тротуарной плиткой 449 м²;
- установка нового металлического ограждения - 166 м/п;
- установка бортовых камней бетонных 630 м/п;
- окраска существующих световых опор – 4 шт.;
- установка новых световых опор с прокладкой нового кабеля в траншеи – 4шт.;
- установка садовых скамеек 8 шт.;
- установка бетонных урн 8 шт.


Работы по объекту начаты с 01.05.2021; завершены 29.11.2021.

Подрядной организации предъявлены штрафные санкции за несоблюдение сроков выполнения работ.

До начала работ:



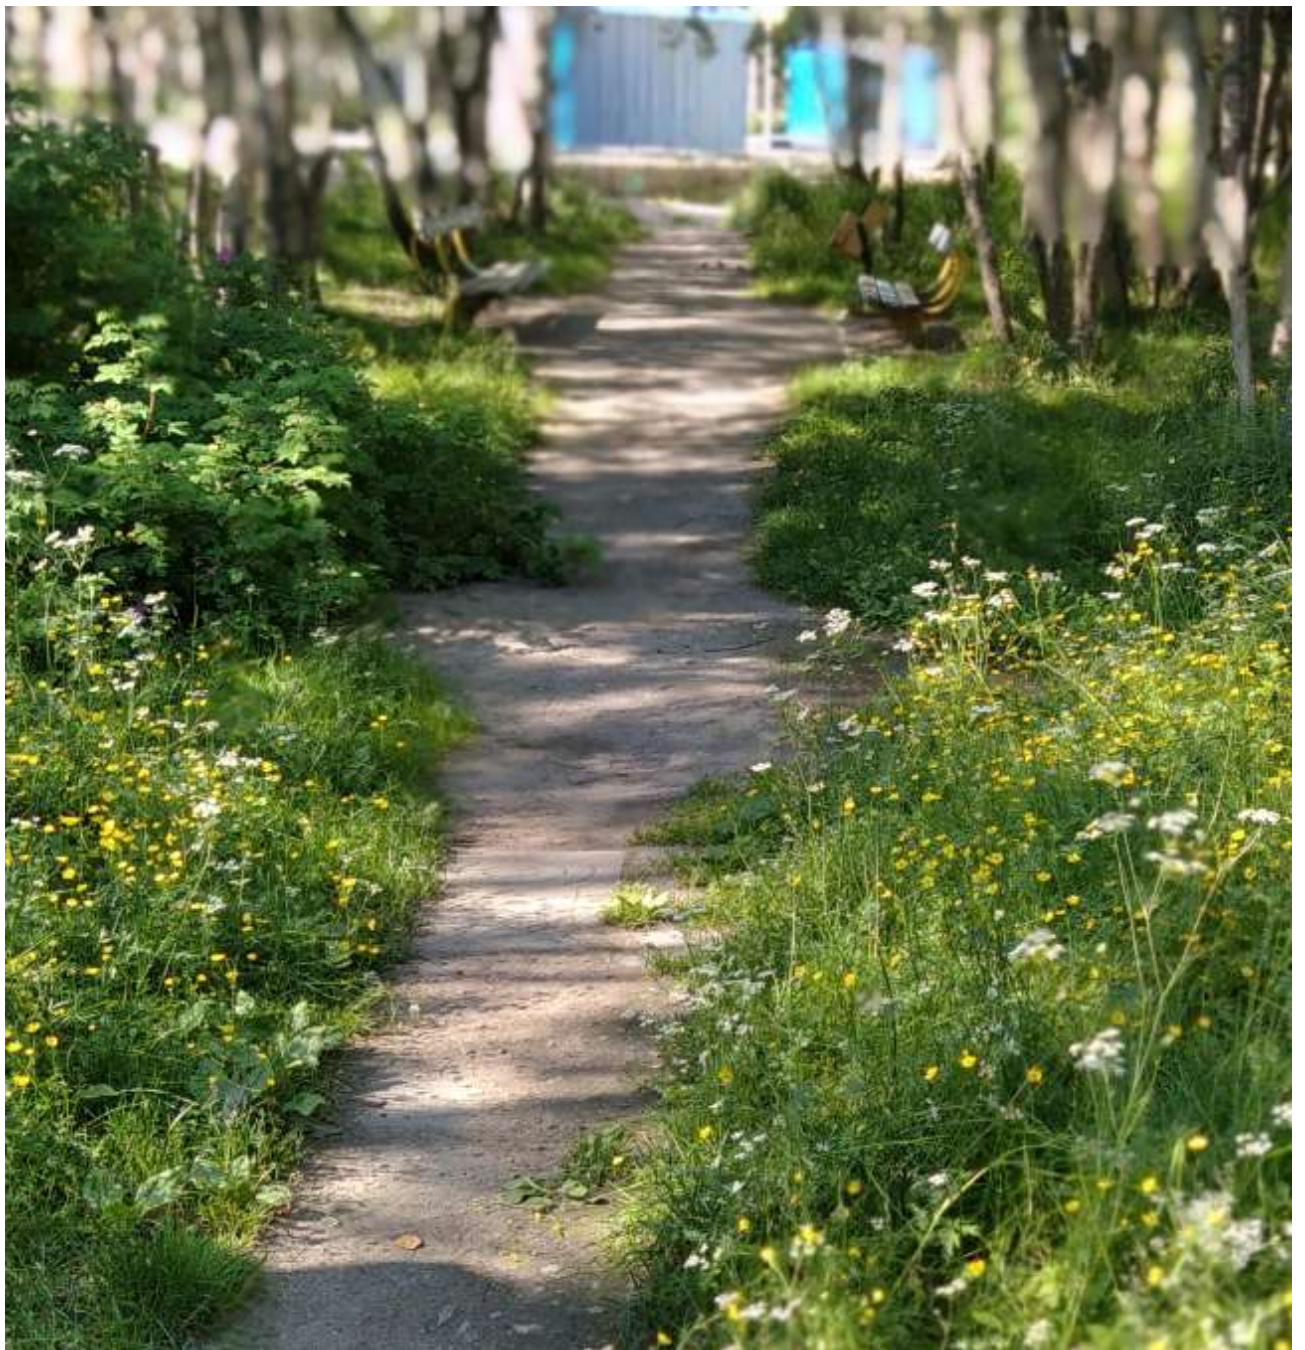

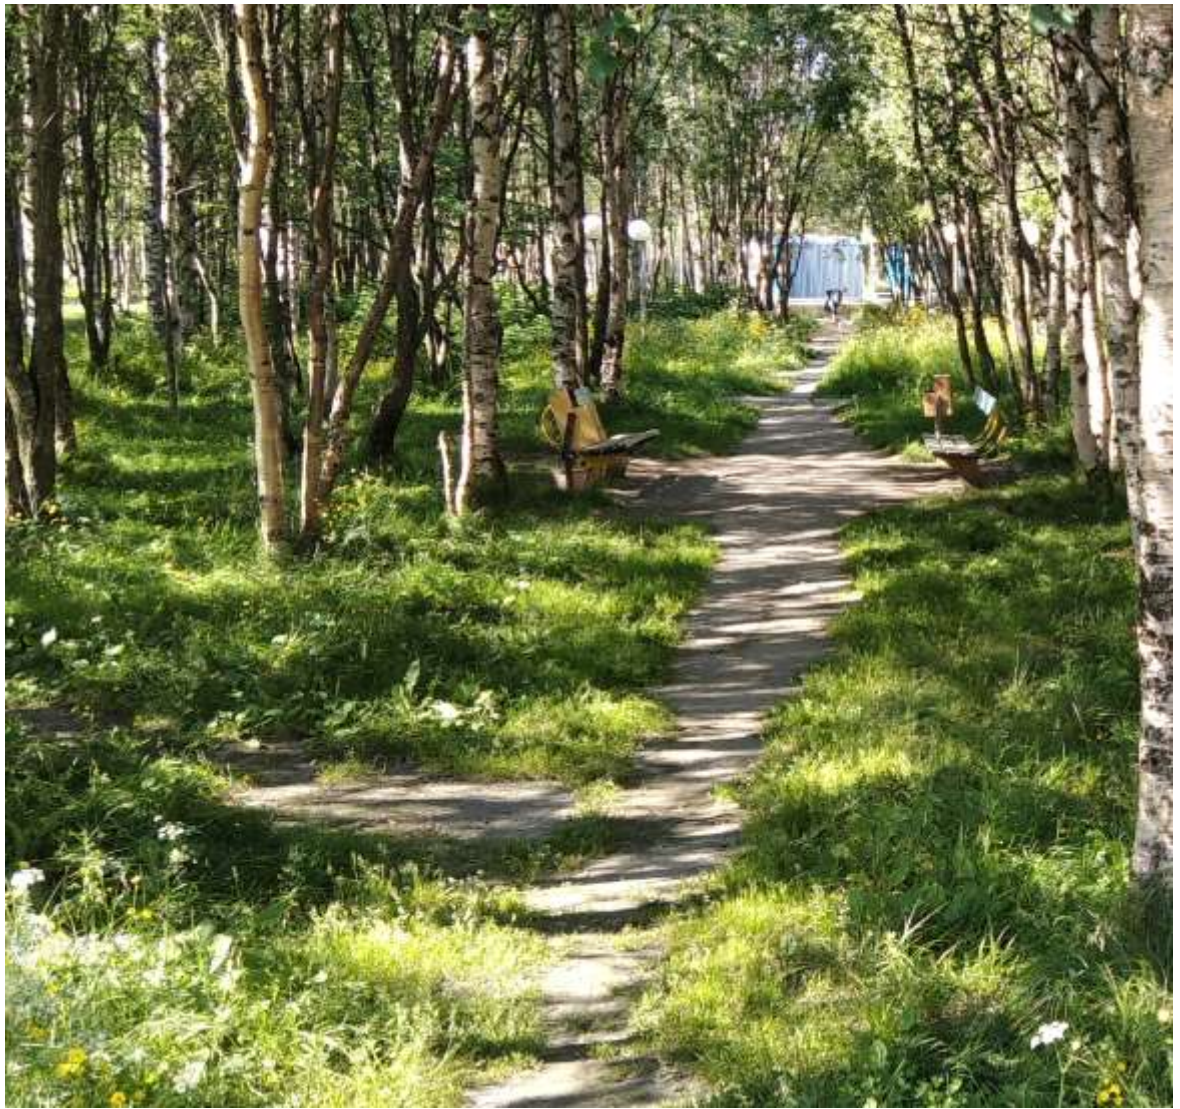

**По состоянию на 20.05.2021
ведутся подготовительные работы на объекте:**

1. Установлен информационный щит.



2. Произведена разборка старых покрытий пешеходных дорожек.





3. Произведен демонтаж старого металлического ограждения, начаты работы по разработки траншей под бортовой камень.



По состоянию на 24.06.2021 года
Продолжаются подготовительные работы на объекте:

1. Завершены работы по разработке траншей под бортовой камень.



2. Произведена геодезическая разметка территории.



По состоянию на 08.07.2021 года

- 1. Завершена разборка старых покрытий пешеходных дорожек.**
- 2. Завершены работы по демонтажу старого металлического ограждения.**



**По состоянию на 15.07.2021 года
проводится разработка траншей для прокладки кабеля.**





По состоянию на 29.07.2021

- продолжается разработка траншей для прокладки кабеля.




По состоянию на 05.08.2021

- завершена разработка траншей для прокладки кабеля.



По состоянию на 12.08.2021

**Ведутся работы по устройству подстилающих и выравнивающих
слоев оснований из щебня.**

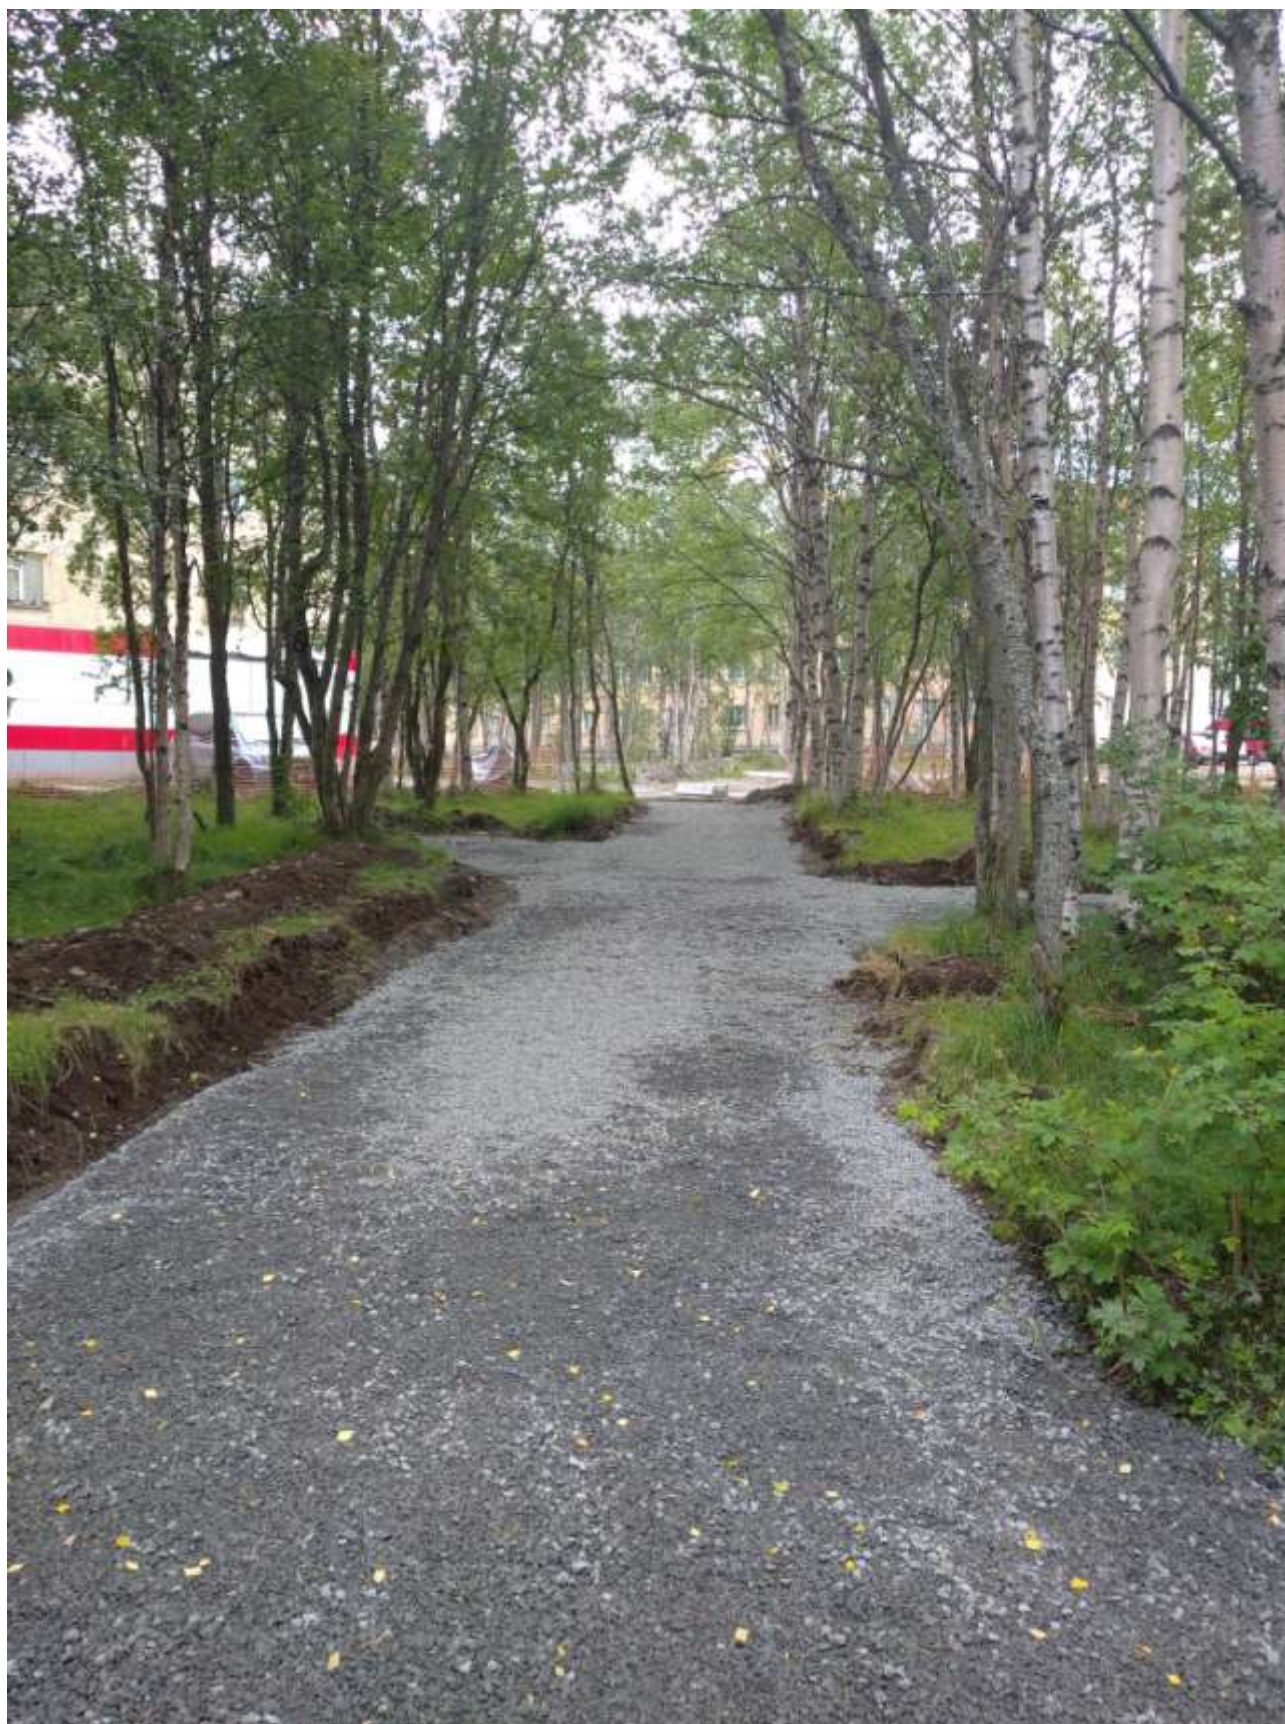

По состоянию на 20.08.2021

**Завершены работы по устройству подстилающих и выравнивающих
слоев оснований из щебня.**



Ведутся работы по установке нового бортового камня.




**По состоянию на 26.08.2021 на объекте:
продолжаются работы по установке нового бортового камня.**





**По состоянию на 01.09.2021 на объекте:
завершены работы по установке нового бортового камня.**

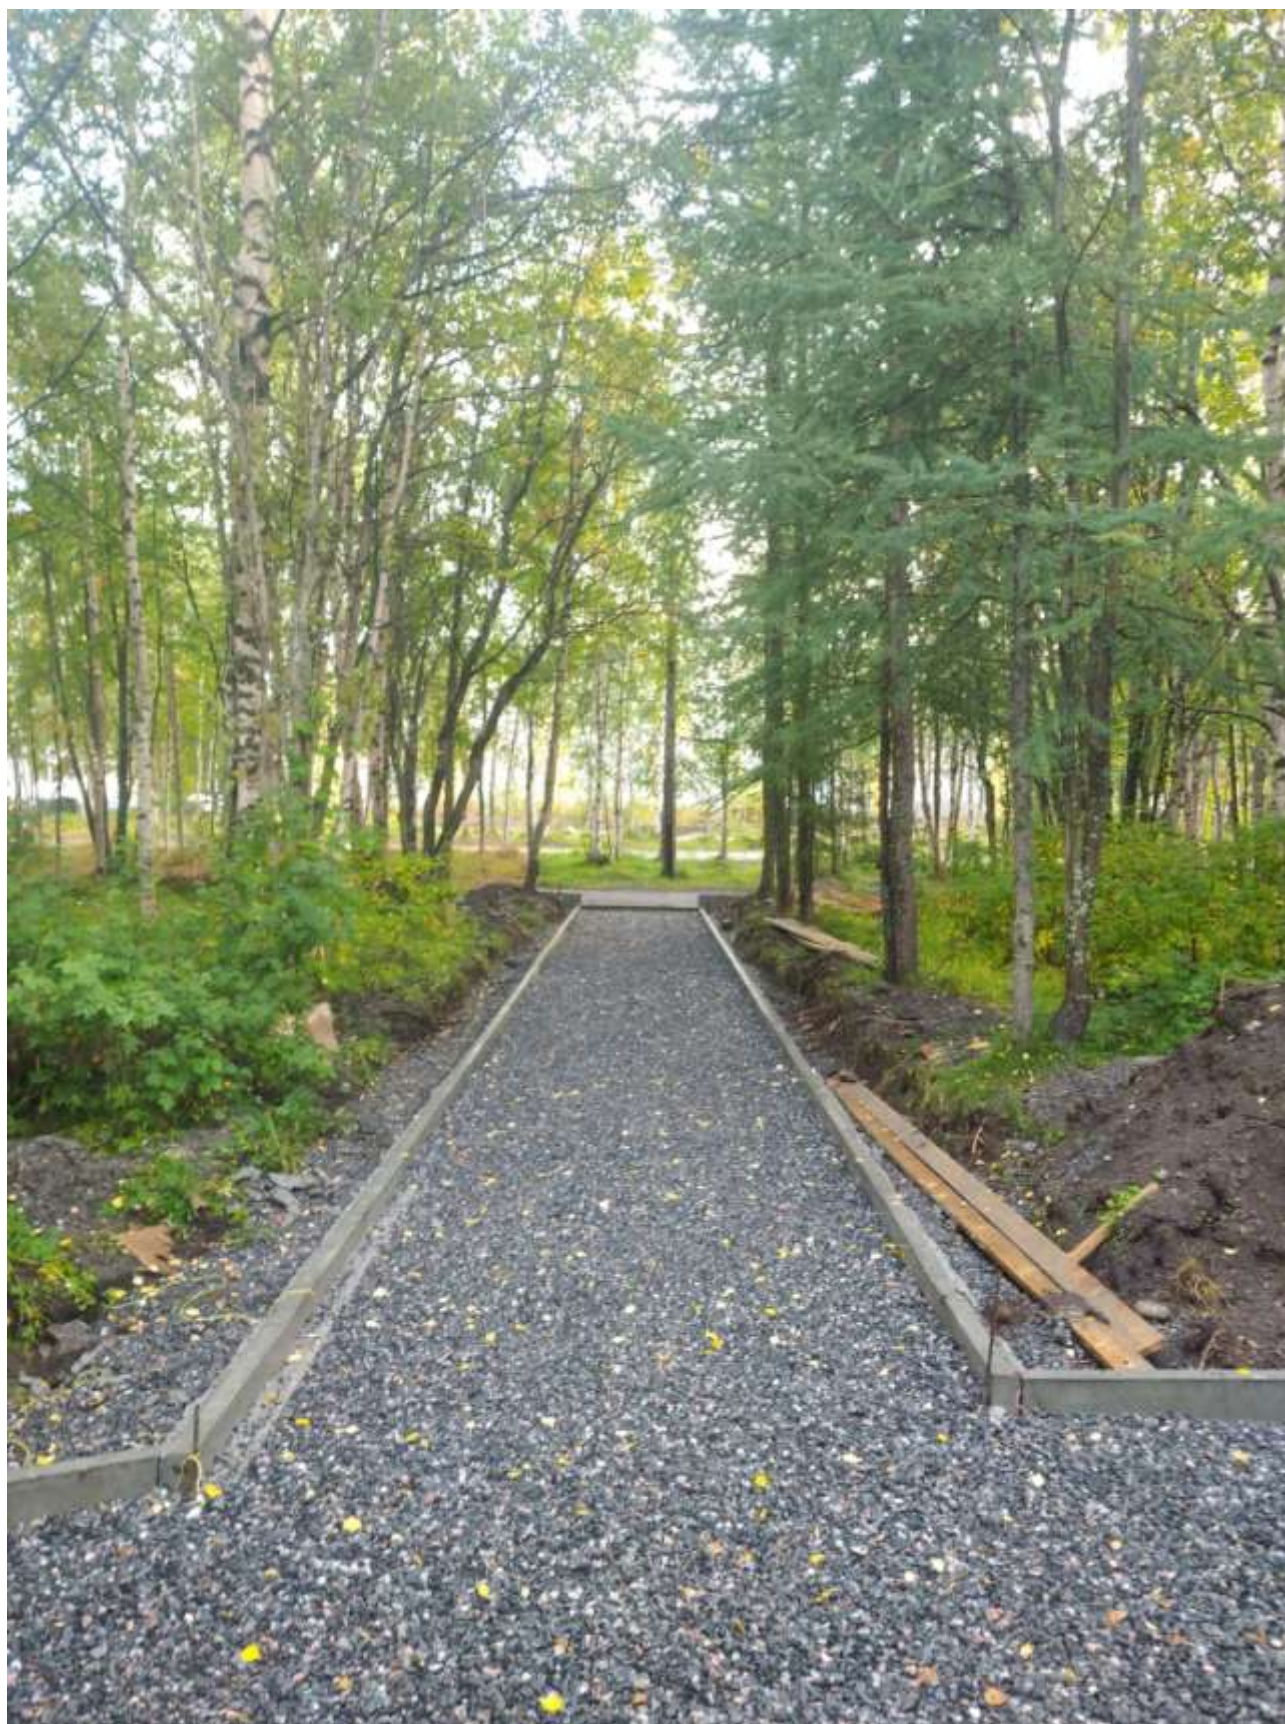

**По состоянию на 09.09.2021 на объекте:
ведутся работы по устройству подстилающих и выравнивающих
слоев оснований из песка.**



По состоянию на 16.09.2021 на объекте:

- 1. Завершены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.**
- 2. Начаты работы по укладке тротуарной плитки.**



**По состоянию на 23.09.2021 на объекте:
продолжаются работы по укладке тротуарной плитки.**



По состоянию на 22.10.2021 на объекте:
1. Завершены работы по укладке тротуарной плитки.



2. Завершены работы по монтажу тактильной плитки.



**По состоянию на 28.10.2021 на объекте:
Подготовлены основания под опоры освещения**



По состоянию на 03.11.2021 на объекте:

- 1. Установлены скамейки и опоры освещения.**
- 2. Проводятся работы по обратной засыпке пазух бортовых камней.**





По состоянию на 11.11.2021 года на объекте:


1. Продолжаются работы по обратной засыпке.






По состоянию на 18.11.2021 года на объекте:

Начаты работы по устройству металлического ограждения зоны отдыха

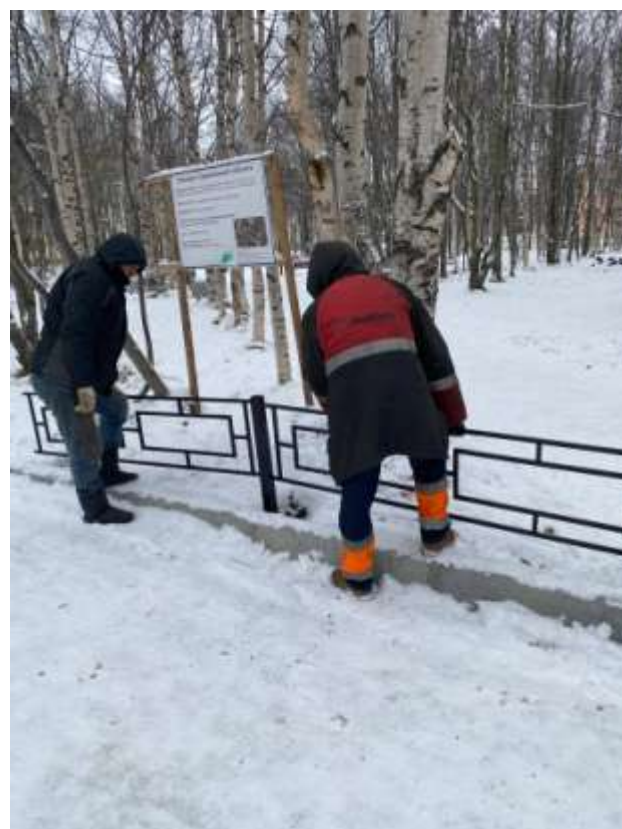

По состоянию на 25.11.2021 года на объекте:

Продолжаются работы по устройству металлического ограждения зоны отдыха

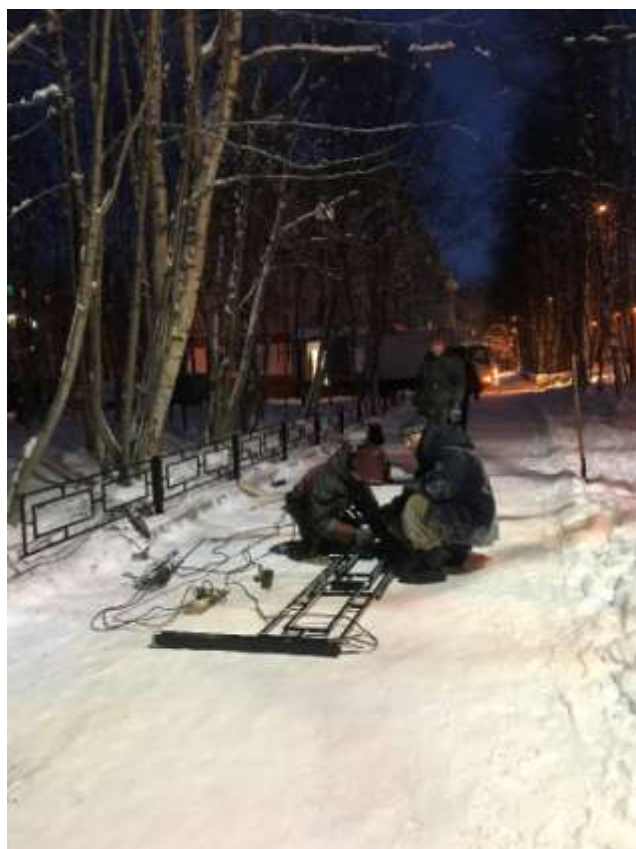

**По состоянию на 02.12.2021 работы на объекте полностью завершены.
Объект принят в эксплуатацию 29.11.2021.**

