

**Благоустройство дворовой территории по адресу:
город Оленегорск, по ул. Строительная, д. № 46, 48.**

Объект включен в государственную программу Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области», утвержденную Постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденную постановлением Администрации г. Оленегорска от 22.10.2017 № 452 (в редакции постановлений Администрации города Оленегорска от 17.11.2017 № 485, от 28.03.2018 № 229, от 30.05.2018 № 345, от 21.09.2018 № 588, от 26.02.2019 № 90, от 21.03.2019 № 175, от 17.04.2019 № 228, от 11.10.2019 № 734, от 03.02.2020 № 102, от 06.05.2020 № 416, от 13.07.2020 № 567, от 25.09.2020 № 715, от 02.11.2020 № 804, от 19.11.2020 № 836, от 14.01.2021 № 7, от 12.02.2021 № 95, от 12.05.2021 № 332, от 29.12.2021 № 864, от 22.02.2022 № 125, от 23.03.2022 № 219, от 08.04.2022 № 293).

Общая стоимость работ – 13 733 079 (Тринадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи семьдесят девять) рублей 8 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 13 046 425,81 рублей.

- бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сумме 686 653,27 рублей.

Заказчик – МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска.

Подрядчик – ООО «Страда СРО»

ИНН 5101312446

Срок выполнения работ: с 01.06.2022 по 31.08.2022.

Проектно – сметной документацией предусмотрено:

- ремонт дорожного покрытия внутри дворовых проездов;
- ремонт тротуарного покрытия дворовых территорий;
- замена чугунных люков колодцев и камер;
- установка бортовых камней;
- устройство гостевых стоянок для автомобилей.

До начала работ





По состоянию на 20.06.2022 на объекте ведутся работы:

- по разборке существующих бортовых камней;**
- по разработке траншей для устройства новых бортовых камней.**



По состоянию на 24.06.2022 на объекте:

- продолжаются работы по разработке траншей для устройства новых бортовых камней;
- начаты работы по устройству оснований под бортовые камни и установке новых бортовых камней.



По состоянию на 07.07.2022 на объекте:

- **завершены работы по разработке траншей для устройства новых бортовых камней;**
- **выполнены работы по разборке оснований существующего асфальтобетонного покрытия на тротуарах;**
- **ведутся работы по устройству основания из щебня под бортовой камень;**
- **ведутся работы по установке нового бортового камня с применением бетона.**





По состоянию на 19.07.2022 на объекте:

- продолжаются работы по установке нового бортового камня с применением бетона;
- приступили к работам по исправлению профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала.



По состоянию на 04.08.2022 на объекте:

- завершены работы по установке нового бортового камня с применением бетона;
- приступили к работам по обратной засыпке пазух у бортового камня;
- продолжаются работы по исправлению профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала;
- ведутся работы по замене чугунных люков колодцев и камер;
- производится устройство подстилающих слоев из щебня.



По состоянию на 18.08.2022 на объекте:


- **продолжаются работы по обратной засыпке пазух у бортового камня, по исправлению профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, по замене чугунных люков колодцев и камер и по устройству подстилающих слоев из щебня.**
- **выполняются работы по устройству водоотводных лотков.**





По состоянию на 01.09.2022 на объекте:

- **завершены работы по обратной засыпке пазух у бортового камня, по исправлению профиля оснований щебеночных, по замене чугунных люков колодцев и камер, по устройству подстилающих слоев из щебня и работы по устройству водоотводных лотков;**
- **ведутся работы по устройству асфальтобетонных покрытий.**

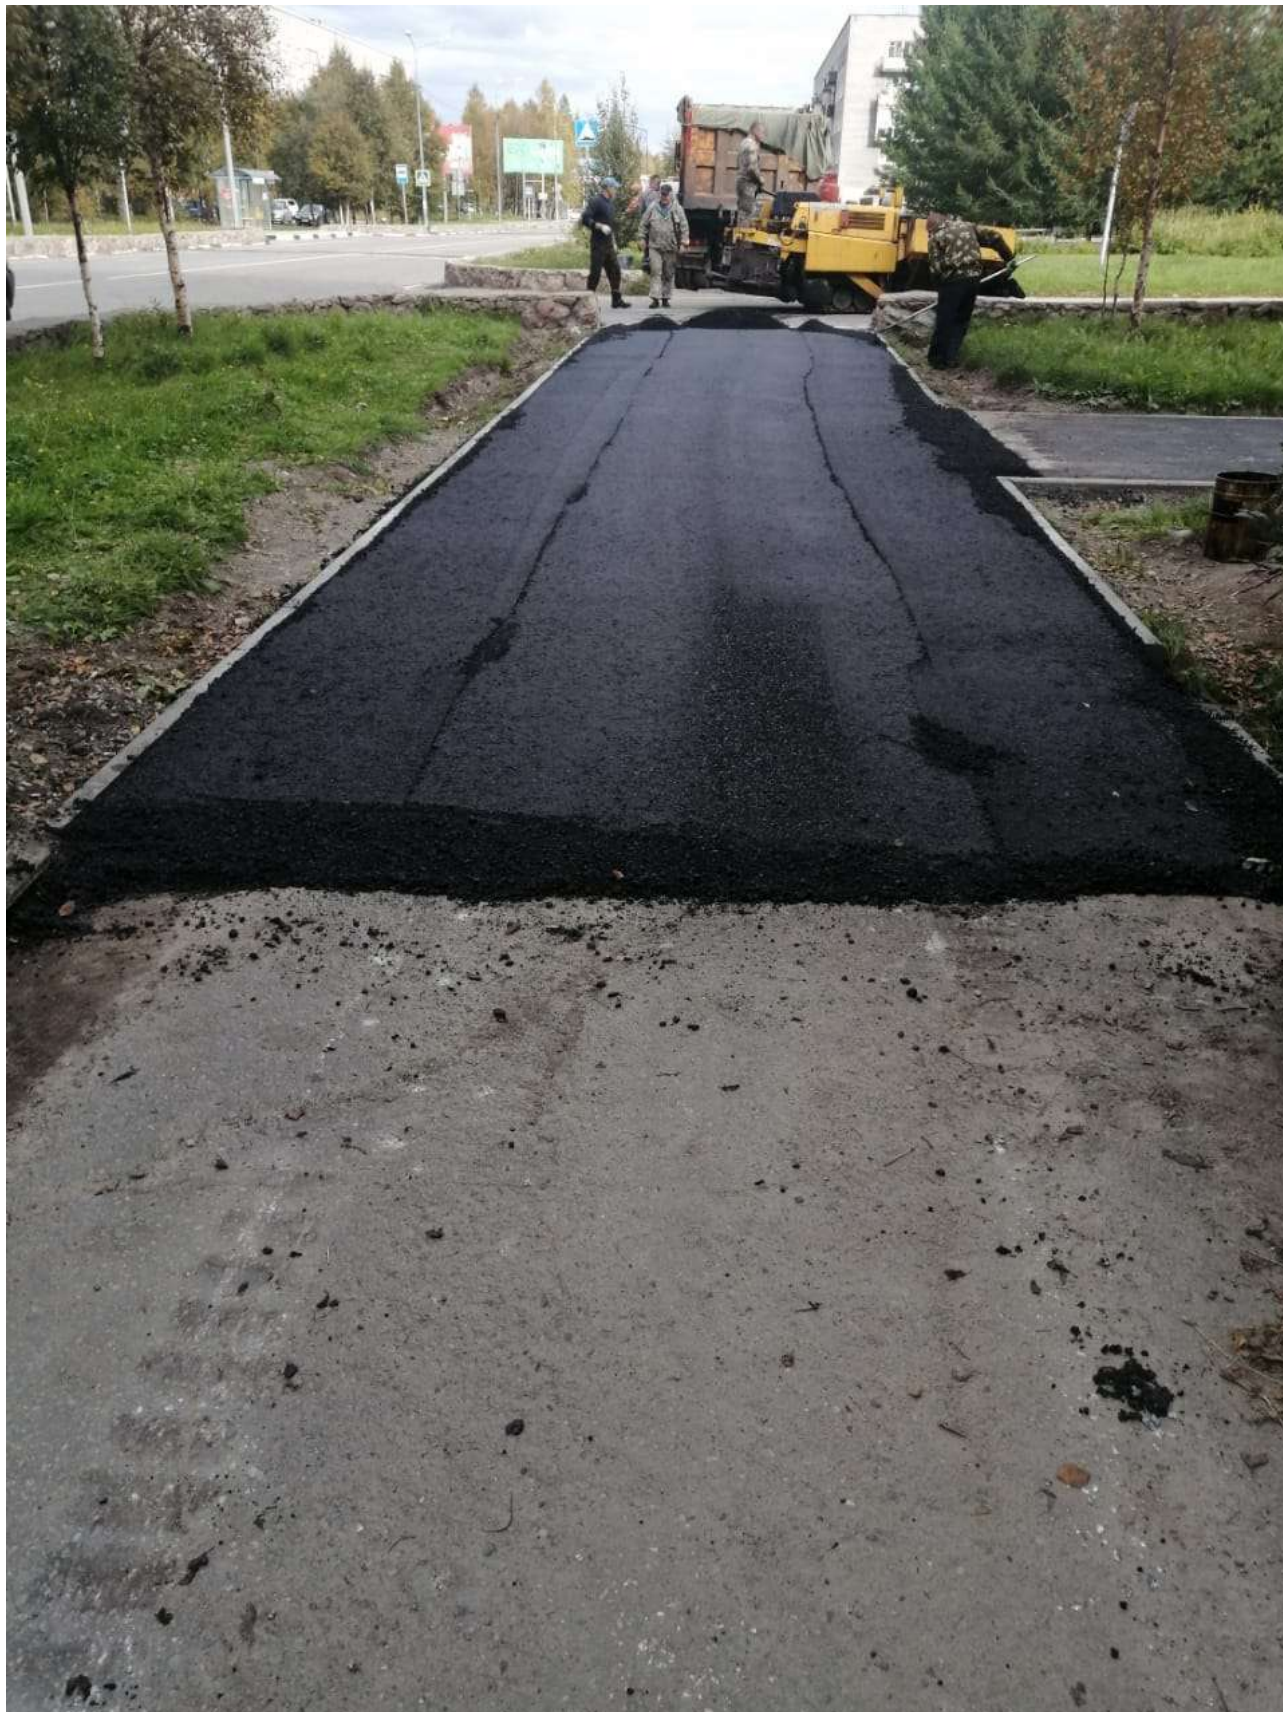



По состоянию на 15.09.2022 на объекте:

- **завершены работы по устройству асфальтобетонных покрытий и по устройству шва-стыка в асфальтобетонном покрытии с применением битума;**
- **начаты работы по устройству металлического пешеходного ограждения.**



По состоянию на 29.09.2022 на объекте:
- завершены работы по устройству и покраске металлического пешеходного ограждения.



По состоянию на 07.10.2022 работы завершены. Объект принят.



