

**Благоустройство объекта в рамках подготовки к празднованию
70-летия г. Оленегорска
Ремонт подходов к памятнику «Могила Неизвестного солдата»**

Благоустройство объекта реализуется в соответствии с распоряжением Губернатора Мурманской области от 23.10.2018 № 188-РГ «Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке к празднованию 70-летия города Оленегорска Мурманской области».

Общая стоимость работ – 2 750 388,98 (Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 98 копеек без учета НДС.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 2 304 825,99 рублей.
- бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сумме 445 562,99 рублей.

Заказчик – МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска.

Проектировщик – МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска

Подрядчик – ИП Александрова Ирина Владимировна (г. Мурманск) ИНН 519100564649; ОГРНИП 312519007100010.

Срок выполнения работ: с 20.07.2018 по 31.08.2018.

Проектом предусмотрены поднятие уровня автоподъезда и пешеходной дороги к памятнику, установка бортовых камней, прокладка перепускных дренажных безнапорных труб, асфальтирование проезжей и пешеходной части, укрепление щебнем обочин.

Работы начаты с 20.07.2018; завершены – 12.10.2018. Подрядной организации предъявлены штрафные санкции за несоблюдение сроков выполнения работ.

До ремонта:



Вид на памятник с улицы Пионерской (центральная автодорога затоплена)




Пешеходная дорога к памятнику со стороны Ленинградского проспекта



Подходы к мостику затоплены



По состоянию на 30.08.2018:

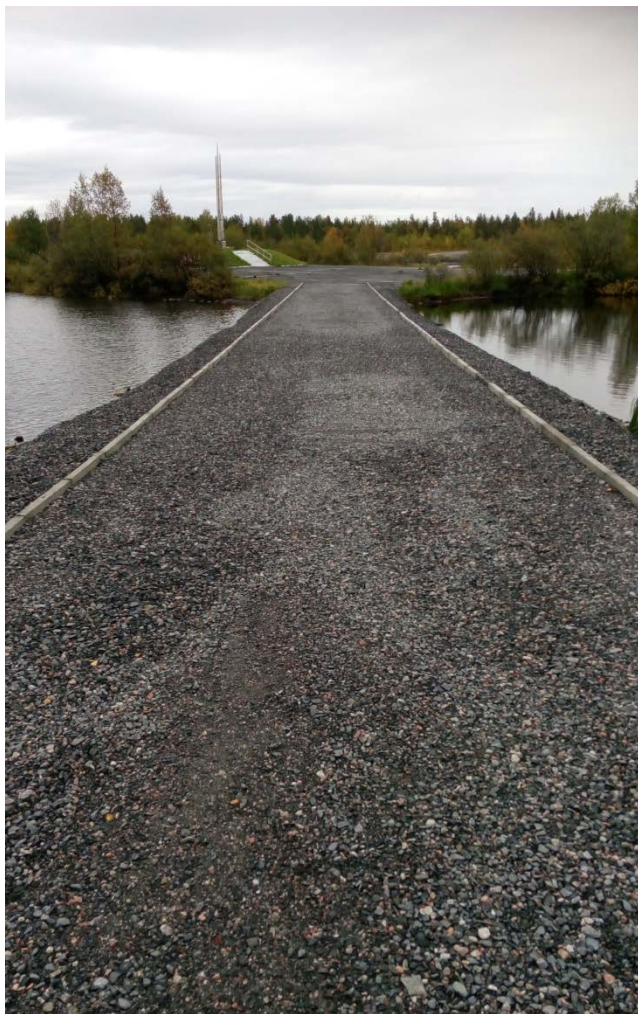

Установлены бортовые камни, продолжается устройство щебеночного основания с уплотнением дорожным катком центральной автодороги



Выполнены демонтаж старого мостика, укрепление несущих балок

По состоянию на 08.09.2018:



Выполнено асфальтирование центральной автодороги со стороны ул. Пионерская




Выполнено асфальтирование пешеходной дорожки от памятника к мостику

По состоянию на 13.09.2018:



Подготовлено под асфальтирование основание, установлены бортовые камни пешеходной дорожки со стороны Ленинградского проспекта

По состоянию на 19.09.2018:

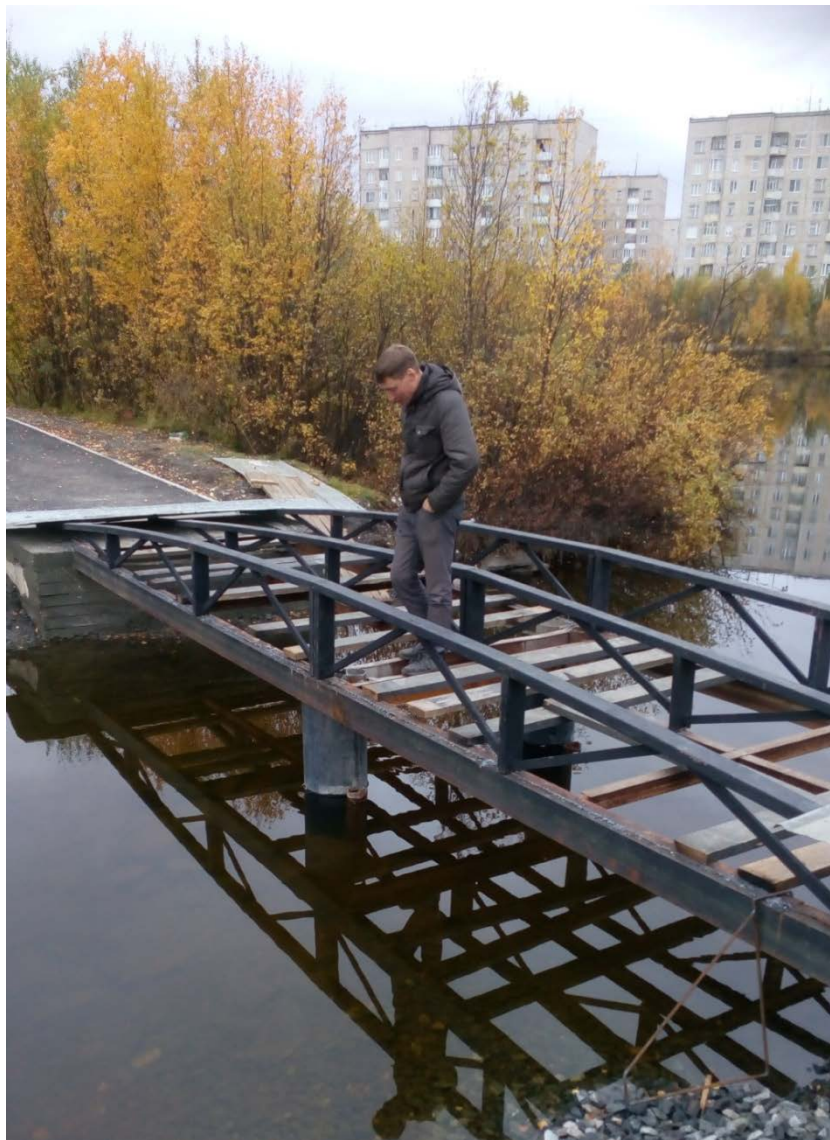


Ведется монтаж опорной части мостика

По состоянию на 28.09.2018:



Сварены металлоконструкции мостика

По состоянию на 02.10.2018:

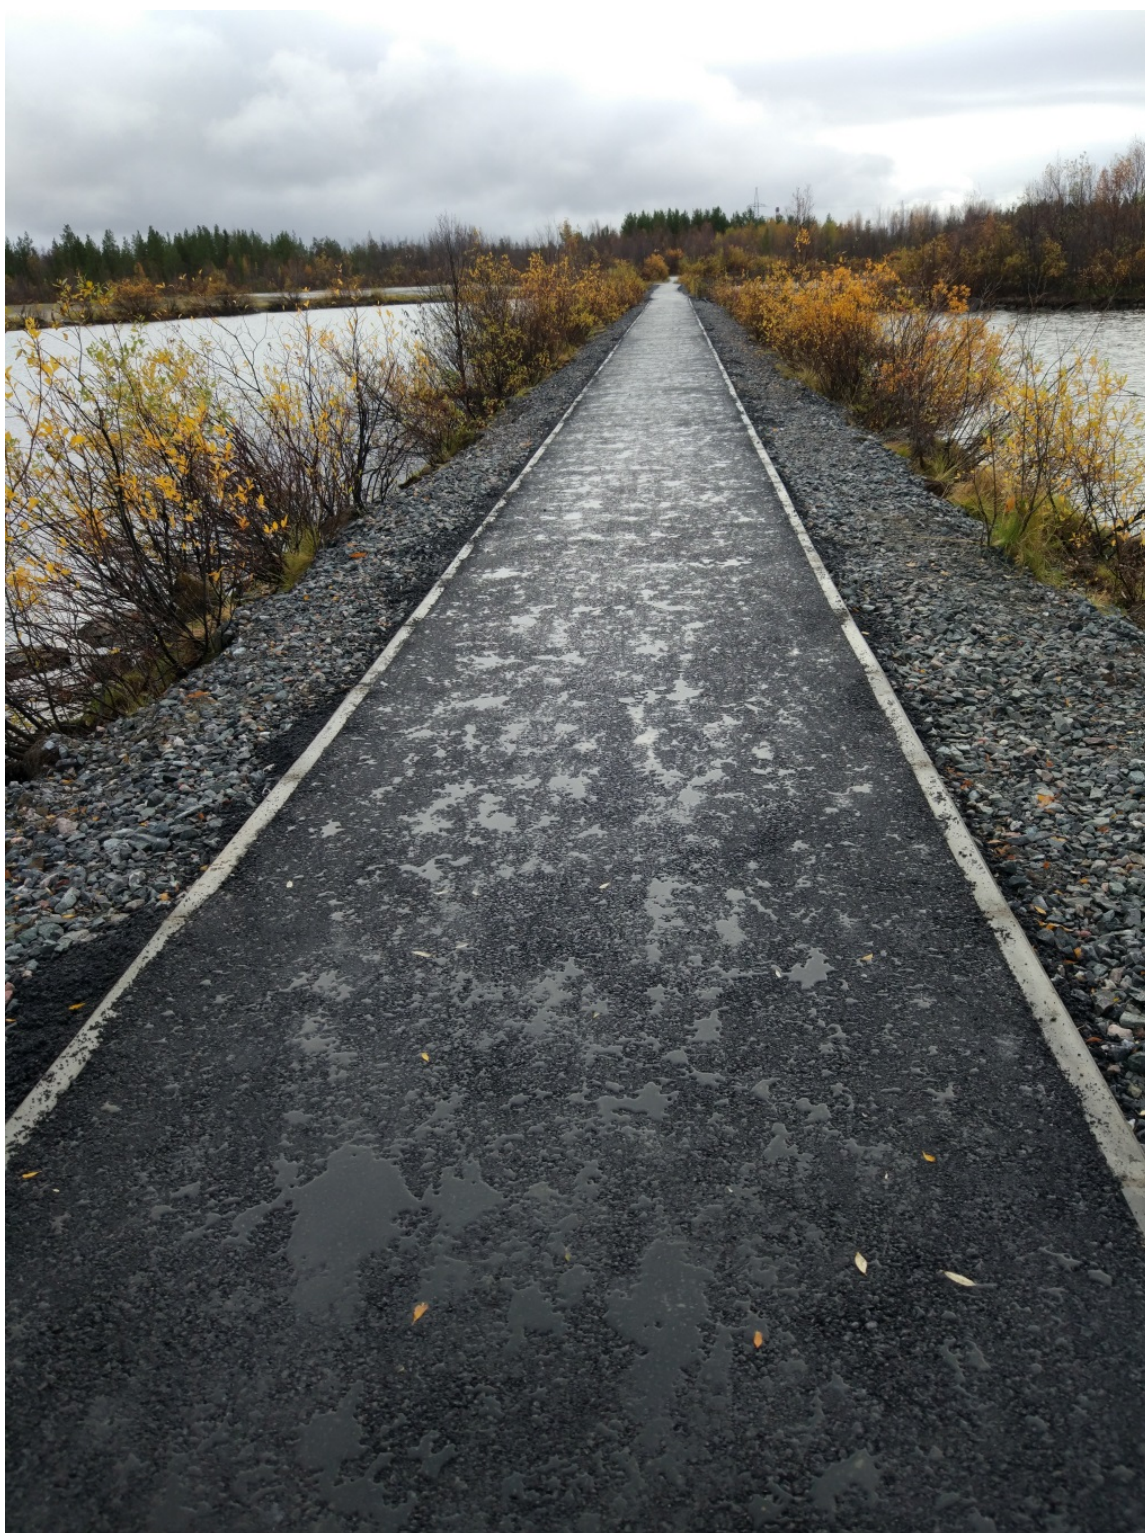

**Выполнено асфальтирование пешеходной дорожки со стороны
Ленинградского проспекта**

По состоянию на 12.10.2018:



Выполнены работы по окраске металлоконструкций мостика



Уложен огрунтованный деревянный настил мостика, работы завершены.
