

**Благоустройство дворовой территории по адресу:
город Оленегорск, улица Бардина, дома №42, №44, №46,
улица Советская, дома №3, №5, улица Мира, дом №29**

Объект включен в государственную программу Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области», утвержденную Постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденную постановлением Администрации г. Оленегорска от 22.10.2017 № 452 (в редакции постановлений Администрации города Оленегорска от 17.11.2017 № 485, от 28.03.2018 № 229, от 30.05.2018 № 345, от 21.09.2018 № 588, от 26.02.2019 № 90, от 21.03.2019 № 175, от 17.04.2019 № 228, от 11.10.2019 № 734, от 03.02.2020 № 102, от 06.05.2020 № 416, от 13.07.2020 № 567, от 25.09.2020 № 715, от 02.11.2020 № 804, от 19.11.2020 № 836, от 14.01.2021 № 7, от 12.02.2021 № 95, от 12.05.2021 № 332).

Общая стоимость работ – 6 524 709,12 (шесть миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи семьсот девять) рублей 12 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 6 198 473,68 рублей.

- бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сумме 326 235,44 рублей.

Заказчик – МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска.

Подрядчик – ИП Кузнецов Вячеслав Станиславович
ИНН 510201408424

Срок выполнения работ: с 25.05.2021 по 30.09.2021.

Проектно – сметной документацией предусмотрено:

- ремонт асфальтобетонного покрытия 3109м²;
- установка бортовых камней.

Работы по объекту начаты с 25.05.2021; завершены 25.10.2021.

Подрядной организации предъявлены штрафные санкции за несоблюдение сроков выполнения работ.

До начала работ







По состоянию на 24.06.2021 на объекте:

- 1. Произведены работы по разборке существующих бортовых камней.**
- 2. На объект доставлен бортовой камень, подготавливается основание под установку бортового камня.**
- 3. Произведены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия.**







**По состоянию на 01.07.2021 на объекте завершены работы
по установке бортового камня**



По состоянию на 08.07.2021 на объекте:

- 1. Завершены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия.**
- 2. Завершены работы по разборке существующих бортовых камней и подготовке основания под новые бортовые камни.**
- 3. Произведены работы по установке бортового камня.**







**По состоянию на 20.08.2021 на объекте:
ведутся работы по замене люков колодцев и камер**



По состоянию на 26.08.2021 на объекте:

- 1. Продолжаются работы по замене люков колодцев и камер.**



2. Ведутся работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня.




**По состоянию на 01.09.2021 на объекте:
Завершены работы по замене люков колодцев и камер
и работы по устройству подстилающих и выравнивающих
слоев оснований из щебня.**





По состоянию на 23.09.2021 на объекте: завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.



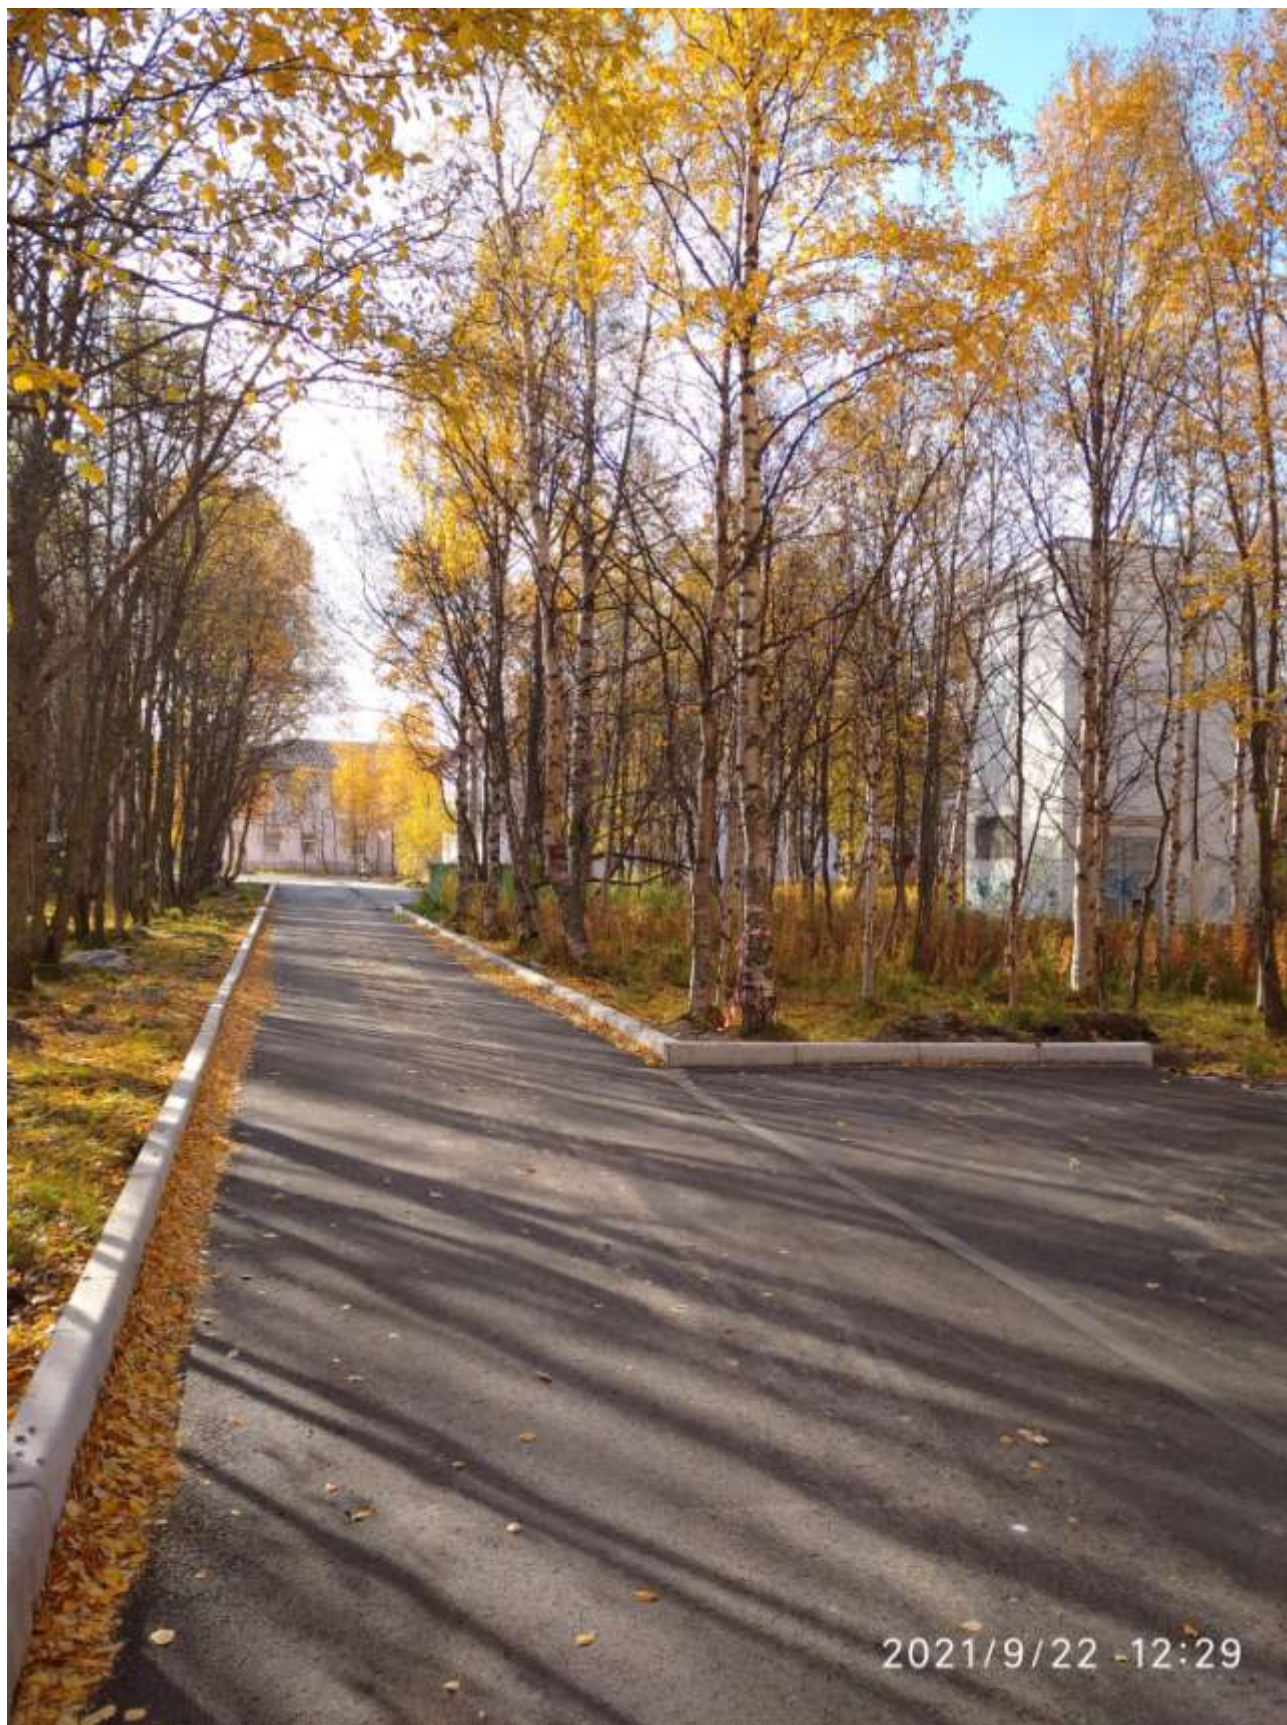

2021/9/22 -12:29

**По состоянию на 30.09.2021 на объекте:
Проводится проливка швов-стыков асфальтобетонного покрытия**





По состоянию на 22.10.2021 подрядной организацией устраняются замечания, выявленные при комиссионном осмотре выполненных работ на объекте.



По состоянию на 28.10.2021

Объект благоустройства завершен. Работы приняты 25.10.2021



