

**Благоустройство дворовой территории по адресу:
город Оленегорск, улица Строительная, дома №37, №39, №43
1 и 2 этапы**

Объект включен в государственную программу Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области», утвержденную Постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденную постановлением Администрации г. Оленегорска от 22.10.2017 № 452 (в редакции постановлений Администрации города Оленегорска от 17.11.2017 № 485, от 28.03.2018 № 229, от 30.05.2018 № 345, от 21.09.2018 № 588, от 26.02.2019 № 90, от 21.03.2019 № 175, от 17.04.2019 № 228, от 11.10.2019 № 734, от 03.02.2020 № 102, от 06.05.2020 № 416, от 13.07.2020 № 567, от 25.09.2020 № 715, от 02.11.2020 № 804, от 19.11.2020 № 836, от 14.01.2021 № 7, от 12.02.2021 № 95, от 12.05.2021 № 332)

По 1 этапу:

Общая стоимость работ – 3 039 473,80 (три миллиона тридцать девять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 80 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 2 887 500,11 рублей.
- бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сумме 151 973,69 рублей.

Заказчик – МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска.

Подрядчик – ИП Трофимов Аркадий Аркадьевич г. Мончегорск
ИНН 510999184325

Срок выполнения работ: с 01.06.2021 по 01.07.2021.

Проектно-сметной документацией предусмотрено:

- ремонт дорожного покрытия внутридворовых проездов 1312 м²;
- устройство элементов сопряжения поверхностей внутридворовых проездов (бортовых камней);
- организация парковочных мест для стоянок автомобилей.

Работы по объекту начаты с 01.06.2021; завершены 01.09.2021.

Подрядной организации предъявлены штрафные санкции за несоблюдение сроков выполнения работ.

По 2 этапу:

Общая стоимость работ – 1 440 555,29 (один миллион четыреста сорок тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 29 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 1 368 527,50 рублей.

- бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сумме 72 027,79 рублей.

Заказчик – МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска.

Подрядчик – Трофимов Аркадий Аркадьевич г. Мончегорск

ИНН 510999184325

Срок выполнения работ: с 28.05.2021 по 30.09.2021.

Вид работ – ремонт дворовых проездов.

Проектно-сметной документацией предусмотрено:

- ремонт асфальтобетонного покрытия 750м²;
- установка бортовых камней.

До начала работ





По состоянию на 24.06.2021 на объекте:

- 1. Произведена геодезическая разметка территории.**
- 2. Производятся работы по срезке асфальтобетонного покрытия.**
- 3. Производятся работы по разборке существующих бортовых камней.**
- 4. Ведутся работы по исправлению профиля оснований под асфальтобетонное покрытие.**
- 5. Производится разработка траншей под бортовой камень.**







По состоянию на 01.07.2021 на объекте завершены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия.



Завершены работы по разработке траншей под бортовой камень.



Производятся работы по установке бортового камня.



По состоянию на 08.07.2021 на объекте:

- 1. Завершены работы по срезке асфальтобетонного покрытия.**
- 2. Завершены работы по разборке существующих бортовых камней и разработке траншей для устройства нового бортового камня.**
- 3. Завершены работы по подготовке основания для устройства новых бортовых камней.**
- 4. Проводятся работы по установке нового бортового камня.**









**По состоянию на 15.07.2021 на объекте:
Продолжаются работы по устройству оснований под бортовые камни и
установка новых бортовых камней.**





**По состоянию на 22.07.2021 на объекте:
Завершены работы по установке новых бортовых камней.**





По состоянию на 29.07.2021 на объекте:

- 1. Завершены работы по разборке асфальтобетонных покрытий и оснований с помощью отбойных молотков внутридворовых проездов;**
- 2. Ведутся работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.**





По состоянию на 05.08.2021 на объекте:

- 1. Закончены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.**
- 2. Ведутся работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня.**
- 3. Выполнены работы по замене люков колодцев и камер.**






По состоянию на 12.08.2021 на объекте:

- 1. Завершены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня.**
- 2. Ведутся работы по укладке асфальтобетонной смеси.**




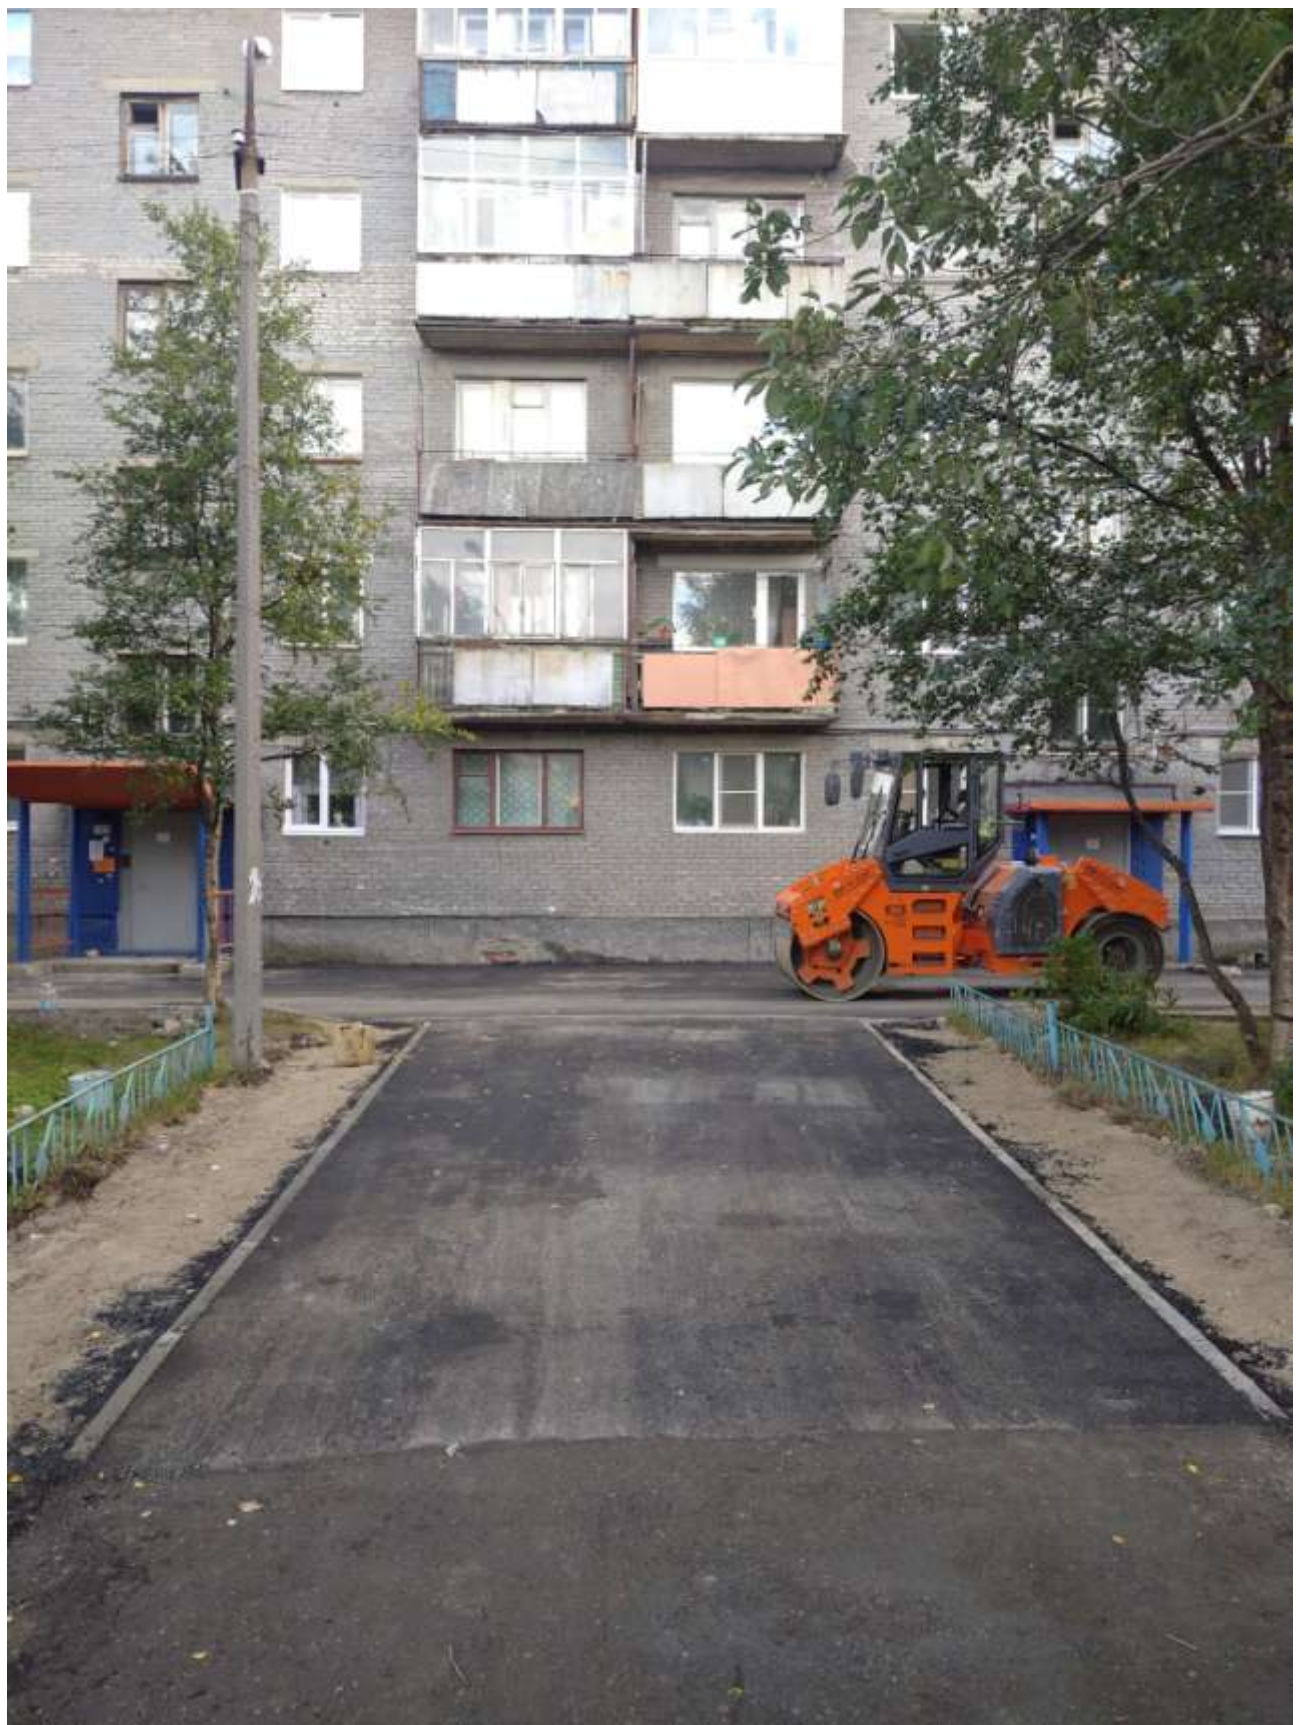

По состоянию на 20.08.2021 на объекте продолжаются работы по укладке асфальтобетонной смеси.



По состоянию на 26.08.2021 на объекте завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.

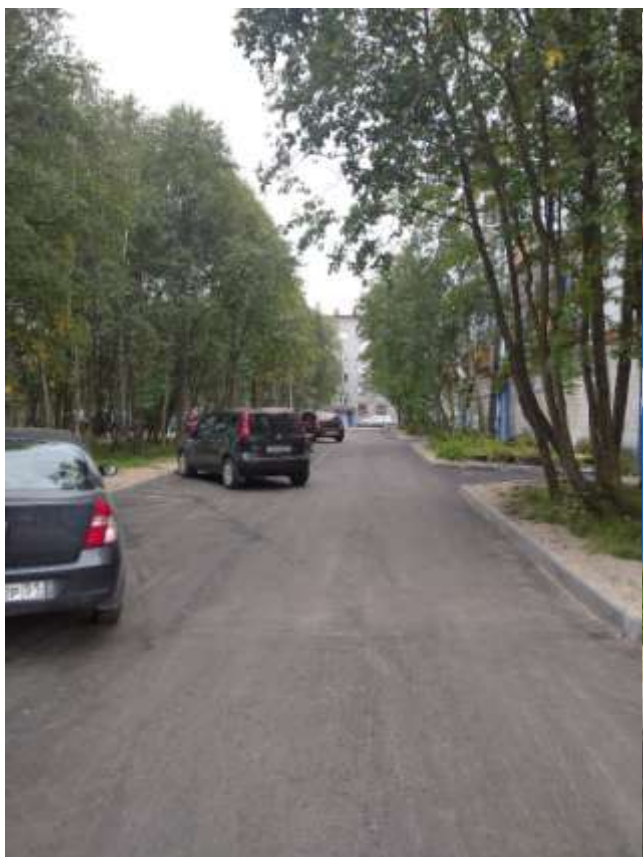

**По состоянию на 01.09.2021 работы на объекте полностью завершены.
Объект принят в эксплуатацию.**

