

**Благоустройство дворовой территории по адресу:
город Оленегорск, по ул. Пионерская, д. № 3, № 5, № 14 в г. Оленегорске**

Объект включен в государственную программу Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области», утвержденную Постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденную постановлением Администрации г. Оленегорска от 22.10.2017 № 452 (в редакции постановлений Администрации города Оленегорска от 17.11.2017 № 485, от 28.03.2018 № 229, от 30.05.2018 № 345, от 21.09.2018 № 588, от 26.02.2019 № 90, от 21.03.2019 № 175, от 17.04.2019 № 228, от 11.10.2019 № 734, от 03.02.2020 № 102, от 06.05.2020 № 416, от 13.07.2020 № 567, от 25.09.2020 № 715, от 02.11.2020 № 804, от 19.11.2020 № 836, от 14.01.2021 № 7, от 12.02.2021 № 95, от 12.05.2021 № 332)

Общая стоимость работ – 9 821 475,20 (девять миллионов восемьсот двадцать одна тысяча четыреста семьдесят пять) рублей 20 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 9 330 401,44 рублей.

- бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сумме 491 073,76 рублей.

Заказчик – МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска.

Подрядчик – ИП Кузнецов Вячеслав Станиславович
ИНН 510201408424

Срок выполнения работ: с 25.05.2021 по 30.09.2021.

Проектно – сметной документацией предусмотрено:

- ремонт дорожного покрытия внутри дворовых проездов 1844 м²;
- ремонт тротуарного покрытия дворовых территорий;
- замена чугунных люков колодцев и камер;
- установка бортовых камней;
- устройство гостевых стоянок для автомобилей.

До начала работ





**По состоянию на 01.07.2021 на объекте
произведены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия.**






Ведутся работы по разборке существующих бортовых камней.







По состоянию на 08.07.2021 на объекте:

- 1. Завершены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия.**
- 2. Завершены работы по разборке существующих бортовых камней.**
- 3. Проводятся работы по разработке траншей для устройства бортовых новых камней.**
- 4. Начаты работы по устройству новых бортовых камней.**

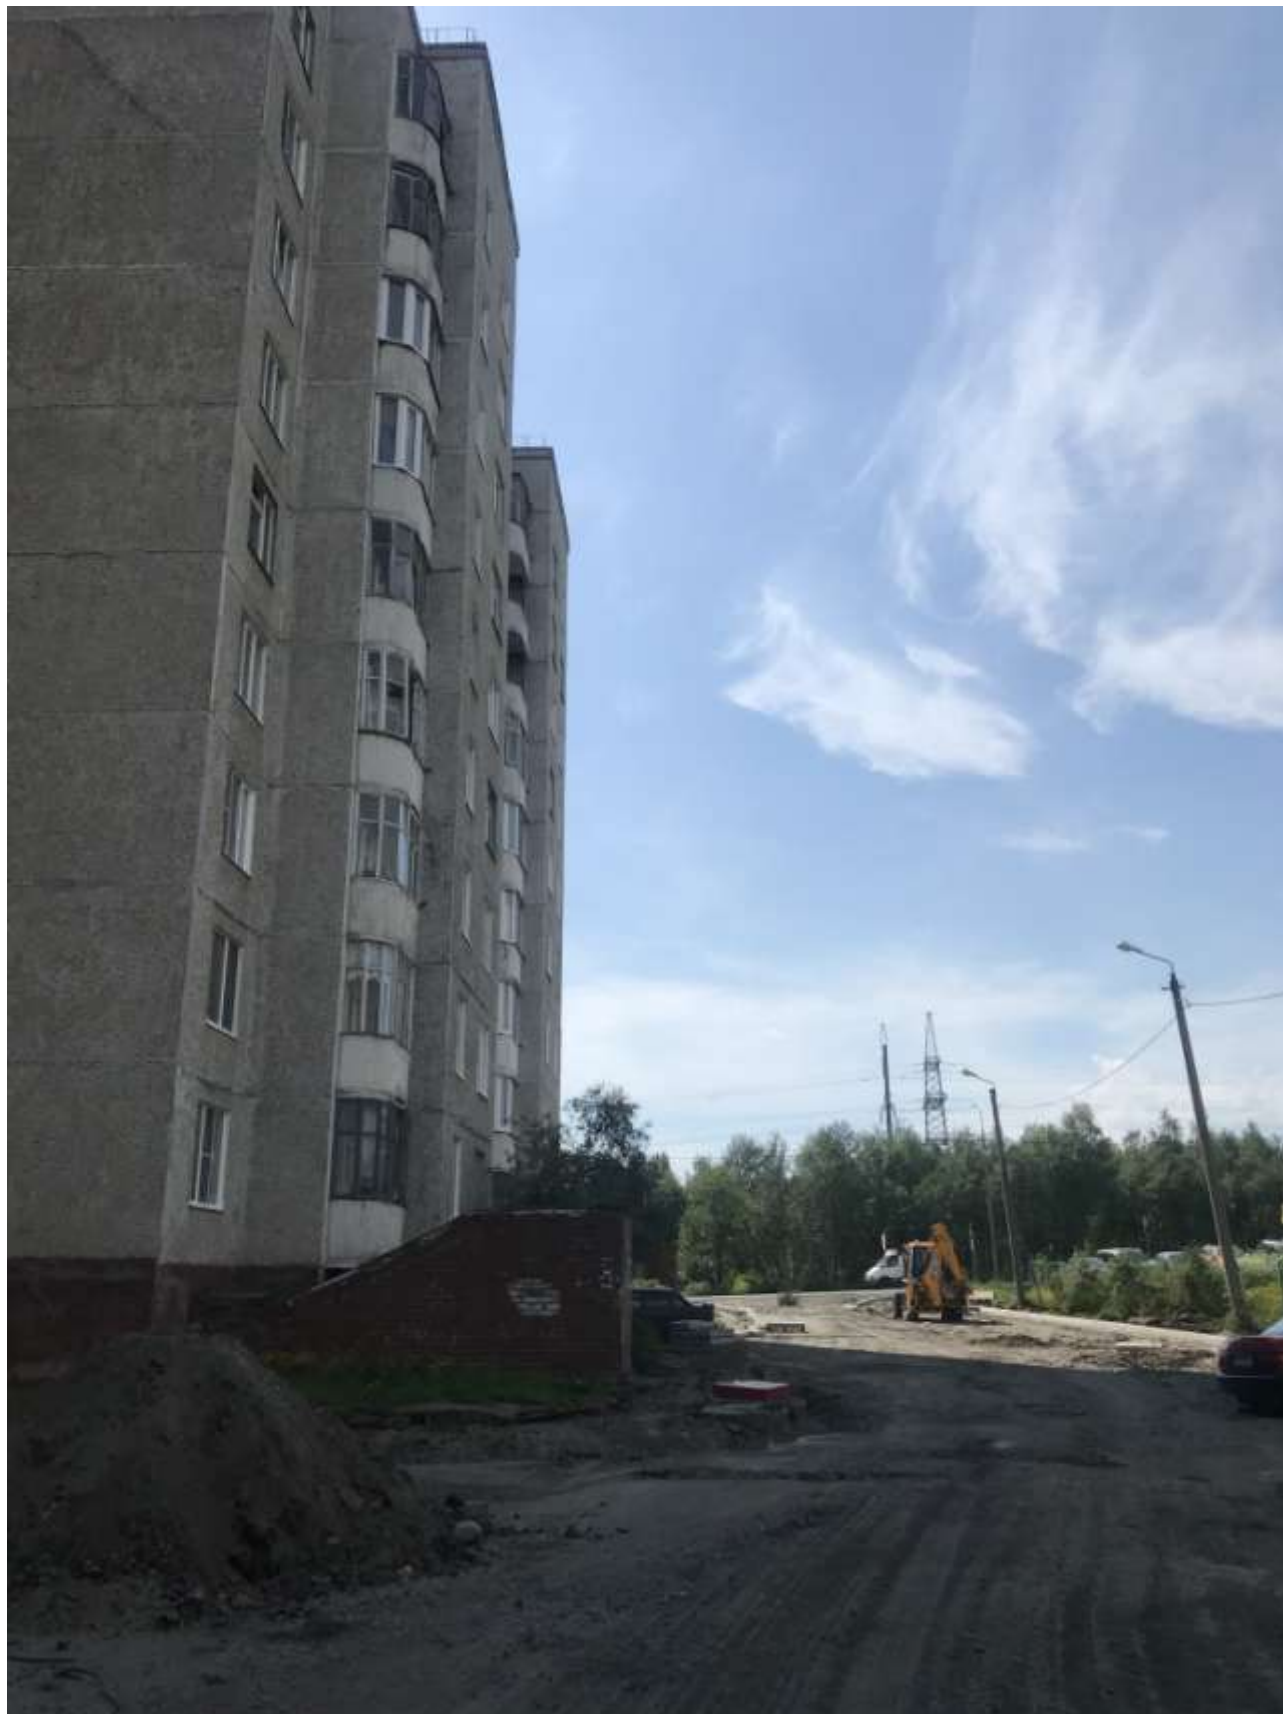

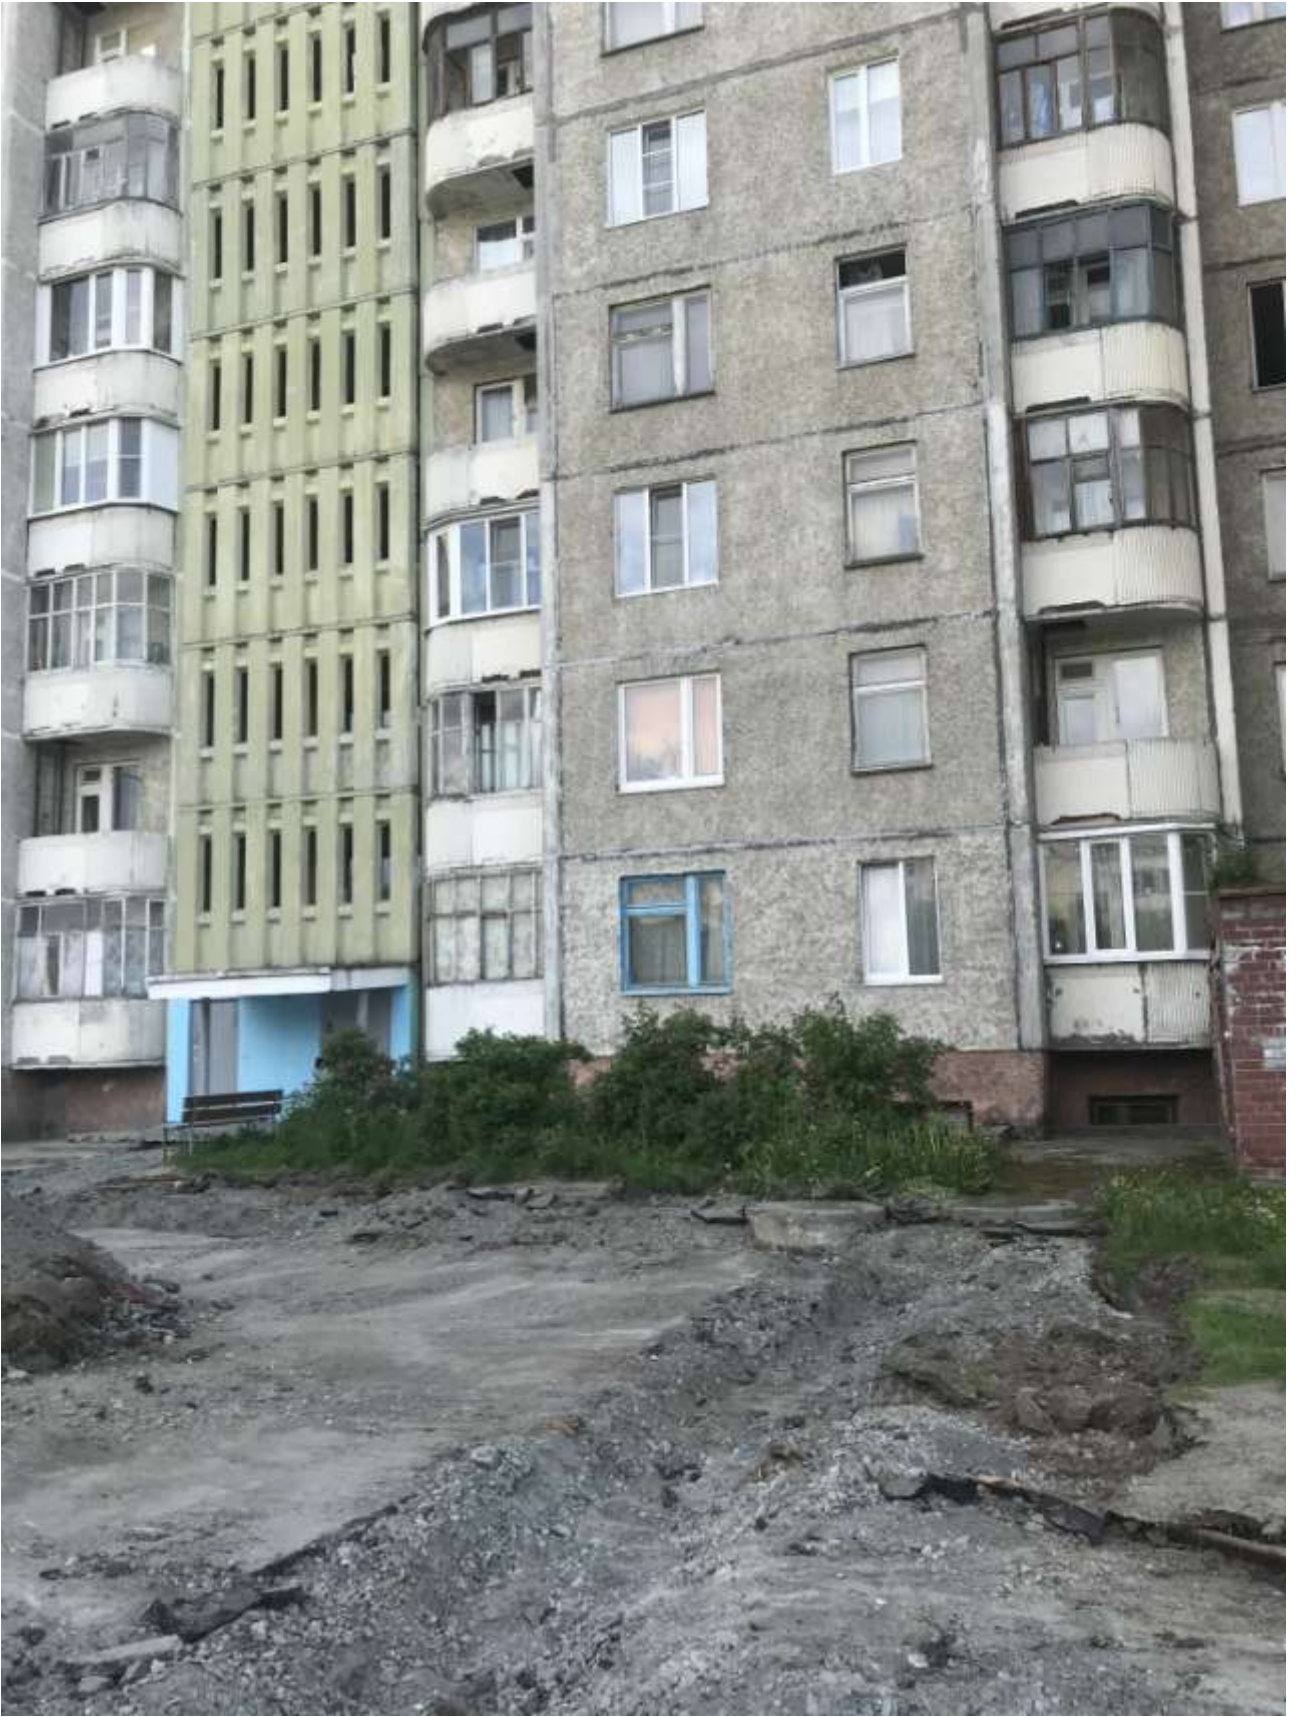

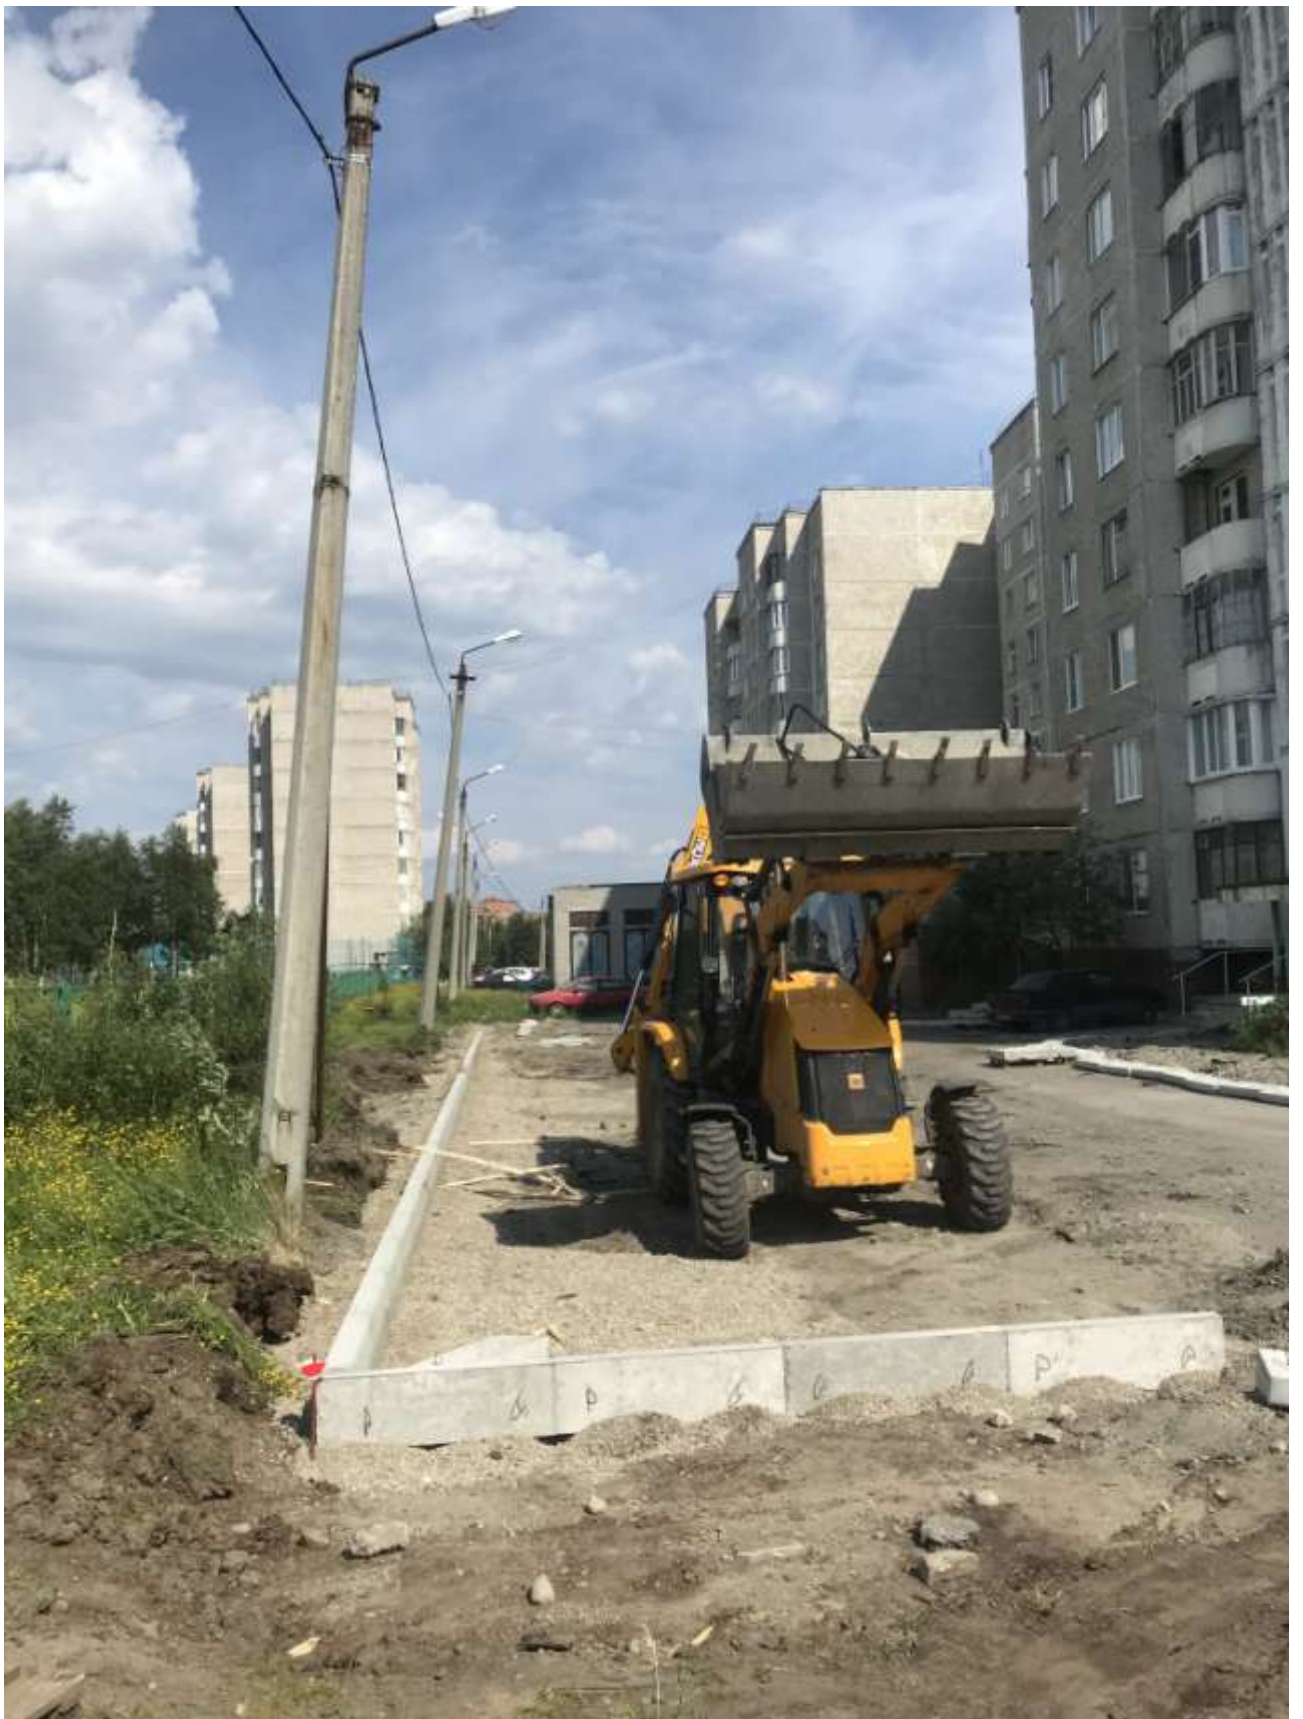

**По состоянию на 15.07.2021 на объекте:
Продолжаются работы по устройству оснований под бортовые камни и
установка новых бортовых камней**





**По состоянию на 22.07.2021 на объекте:
Продолжаются работы по устройству оснований под бортовые камни и
установка новых бортовых камней**





По состоянию на 29.07.2021 на объекте:


1. Завершена установка бортовых камней в районе проезжей части, двух гостевых стоянок по адресу ул. Пионерская д.14
2. Продолжается установка бортовых камней тротуаров по адресу ул. Пионерская д.14



По состоянию на 05.08.2021 на объекте:

- 1. Завершена установка бортовых камней тротуаров и проезжей части по адресам ул. Пионерская д. № 3, № 5, № 14.**



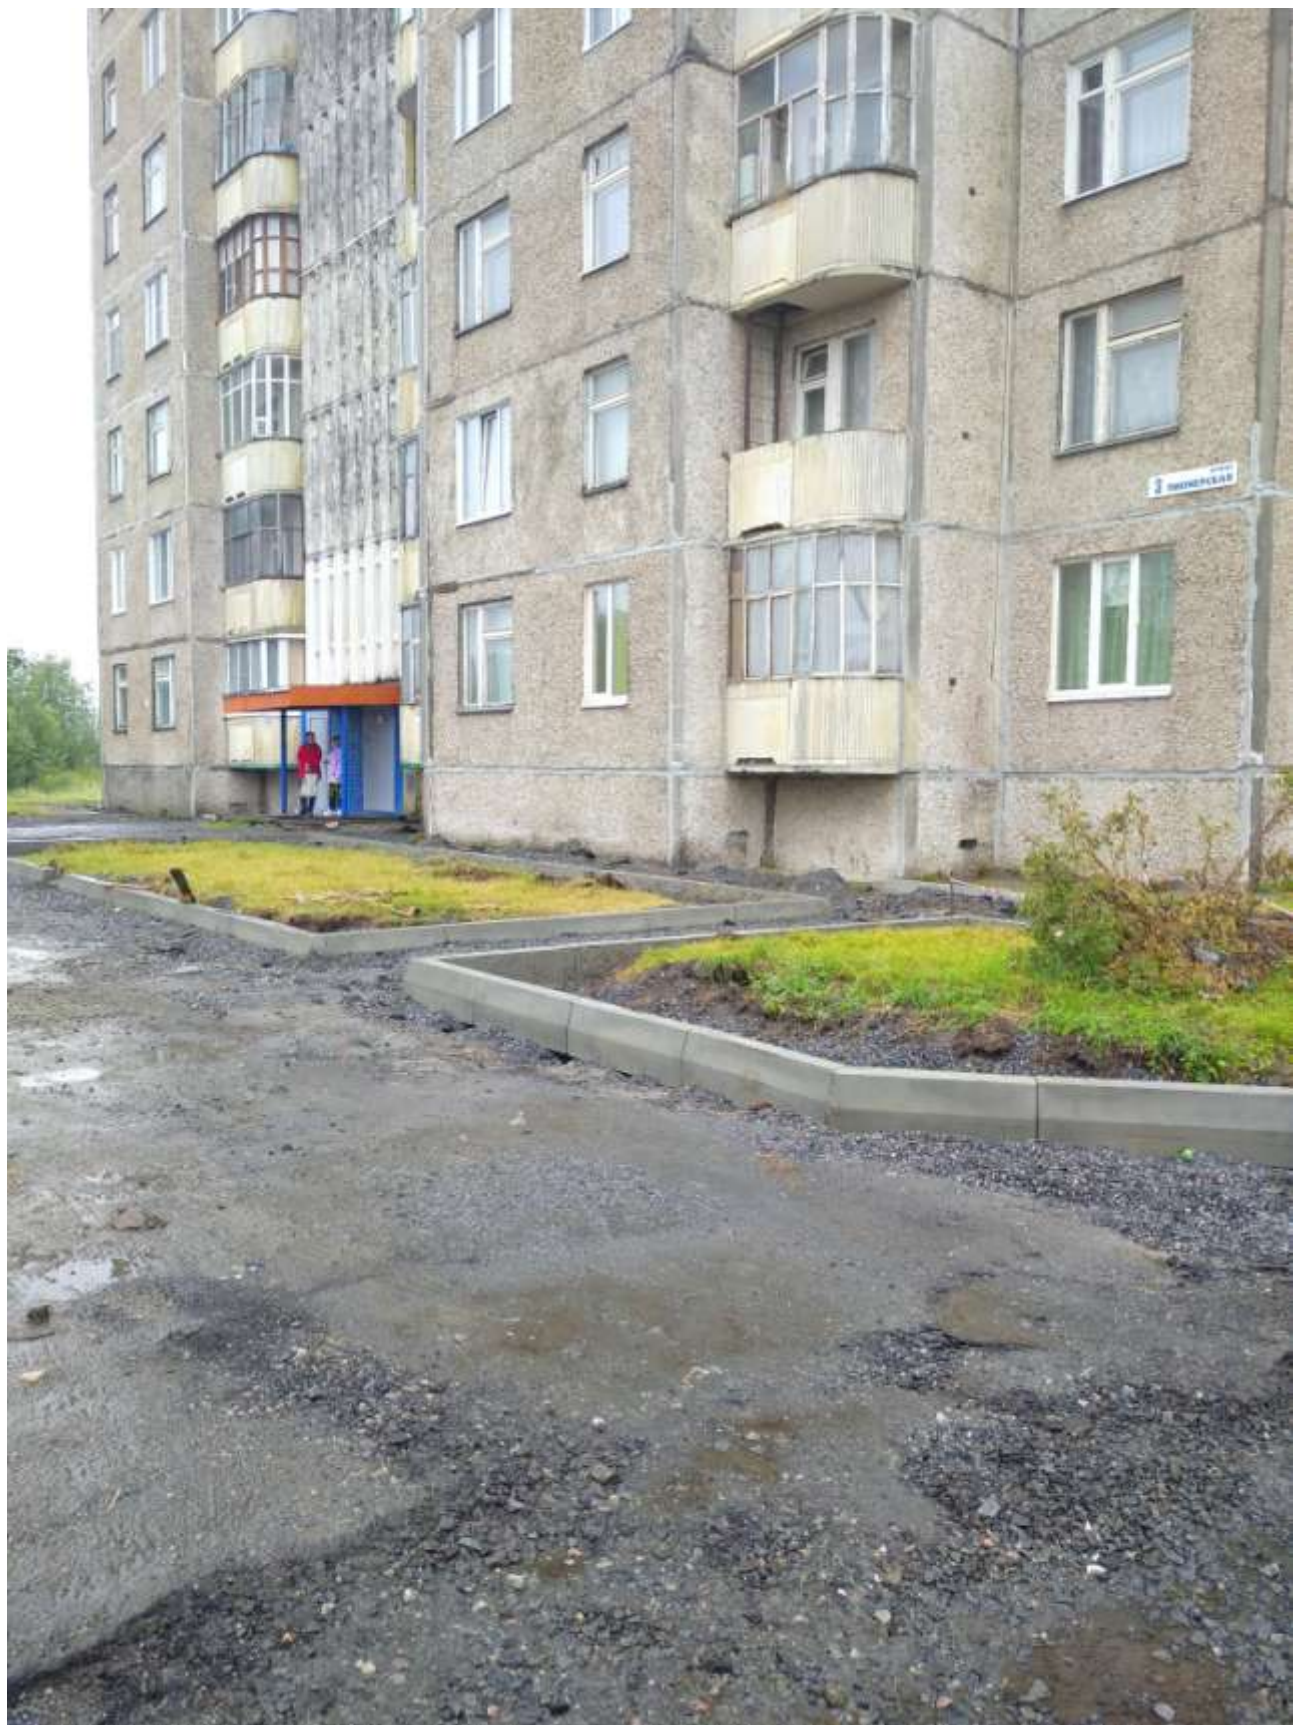

**2. Выполнены работы по замене люков колодцев и камер по адресам
ул. Пионерская д. № 3, № 5.**



По состоянию на 12.08.2021 на объекте:

1. Ведутся работы по замене люков колодцев и камер по адресу:
ул. Пионерская д. № 14.



2. Ведутся работы по исправлению профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала по адресу ул. Пионерская, д. № 5.



По состоянию на 20.08.2021 на объекте:

1. Завершены работы по замене люков колодцев и камер по адресу: ул. Пионерская д. № 14.
2. Завершены работы по исправлению профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала по адресам ул. Пионерская, д. № 5, 14.





**По состоянию на 26.08.2021 на объекте:
завершены работы по исправлению профиля оснований щебеночных с
добавлением нового материала по адресу ул. Пионерская, д. № 3.**



**По состоянию на 09.09.2021 на объекте:
ведется установка бортовых камней тротуара
по адресу ул. Пионерская д. № 3.**



По состоянию на 16.09.2021 на объекте:

ведутся работы по укладке асфальтобетонной смеси.



По состоянию на 23.09.2021 на объекте: завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.



**По состоянию на 30.09.2021 на объекте:
завершены работы по замене чугунных колодцев**



**По состоянию на 22.10.2021 работы на объекте полностью завершены.
Объект принят в эксплуатацию.**

