

**Благоустройство дворовой территории по адресу:
город Оленегорск, ул. Парковая, д. № 16, № 18**

Объект включен в государственную программу Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области», утвержденную Постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» на 2018-2026 годы» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденную постановлением Администрации г. Оленегорска от 22.10.2017 № 452 (в редакции постановлений Администрации города Оленегорска от 17.11.2017 № 485, от 28.03.2018 № 229, от 30.05.2018 № 345, от 21.09.2018 № 588, от 26.02.2019 № 90, от 21.03.2019 № 175, от 17.04.2019 № 228, от 11.10.2019 № 734, от 03.02.2020 № 102, от 06.05.2020 № 416, от 13.07.2020 № 567, от 25.09.2020 № 715, от 02.11.2020 № 804, от 19.11.2020 № 836, от 14.01.2021 № 7, от 12.02.2021 № 95, от 12.05.2021 № 332, от 29.12.2021 № 864, от 22.02.2022 № 125, от 23.03.2022 № 219, от 08.04.2022 № 293, от 07.06.2022 № 608, от 16.06.2022 № 665, от 08.08.2022 № 854, от 26.08.2022 № 940, от 14.09.2022 № 1009, от 16.09.2022 № 1022, от 26.10.2022 № 1136, от 29.11.2022 № 1219, от 31.01.2023 № 45, от 07.03.2023 № 113, от 14.11.2023 № 700, от 05.02.2024 № 69, от 15.02.2024 № 97, от 03.05.2024 № 279).

Общая стоимость работ – 8 182 454,89 (восемь миллионов сто восемьдесят две тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 89 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 7 578 137,69 рублей.
- бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сумме 604 317,2 рублей.

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

Подрядчик – И.П. Кузнецов Вячеслав Станиславович ИНН 510201408424

Срок исполнения контракта установлен 12.09.2024 года и включает срок выполнения работ подрядчиком (предусмотренных контрактом) в полном объеме, срок приемки (с оформлением документа о приемке) и оплаты заказчиком таких работ.

Срок исполнения отдельных этапов контракта:

I этап - с 13.05.2024 по 01.07.2024

(включает срок выполнения работ с 13.05.2024 по 31.05.2024);

II этап - с 01.06.2024 по 26.07.2024

(включает срок выполнения работ 01.06.2024 по 30.06.2024);

III этап - с 01.07.2024 по 12.09.2024

(включает срок выполнения работ с 01.07.2024 по 15.08.2024);

Техническим заданием предусмотрено:

1 ЭТАП

Демонтаж, фрезерование, разборка на дворовых проездах

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования, толщина слоя до 10 см 1527 м²

Демонтаж металлического ограждения 200 п.м.

Демонтаж скамеек (передать заказчику) 8 шт

Демонтаж опор освещения со светильниками 2 шт.

Демонтаж линий электроснабжения СИП (на хранение) 100 п.м

Корчевка деревьев, диаметр деревьев до 32 см 10 шт.

2 ЭТАП

Ремонт дворовых проездов с обустройством автомобильных стоянок

Установка бортовых камней высотой 30 см 150 п.м.
Исправление профиля основания щебеночно-гравийно-песчаной смесью (размер зерен 0-40) толщиной до 7 см 1527 м²
Розлив вяжущих материалов (норма 0,5 кг/м²) 0,76 т
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, толщиной до 5 см 1527 м²
Розлив вяжущих материалов (норма 0,3 кг/м²) 0,46 т
Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси, толщиной 5 см 1527 м²
Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии 150 м шва
Регулирования высотного положения крышек колодцев (установка плавающих крышек, использование доборных колец и (или) плит перекрытий) 14 шт.

Устройство пешеходных дорожек

Установка бортовых камней высотой 20 см 198 п.м.
Устройство основания из песка толщиной 20 см м³
Устройство основания щебеночно-гравийно-песчаной смесью (размер зерен 0-40) толщиной 15 см 302 м²
Розлив вяжущих материалов (норма 0,5 кг/м²) 0,15 т.
Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси, толщиной 5 см 302 м²

3 ЭТАП

Освещение

Бурение ям глубиной до 2 м, группа грунтов 2 - 3 ямы
Устройство основания под фундаменты щебеночного 0,18 м³
Установка закладных деталей весом более 20 кг 0,092 т
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 – 0,24 м³
Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных 0,5 т. опор
Устройство фундаментов-столбов бетонных 0,144 м³
Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м – 3 шт
Установка кронштейнов на опорах для светильников (сварные металлические, количество рожков 2) – 3 шт.
Установка светильников с присоединением к линиям освещения 6 шт.
Подвеска проводов самонесущих изолированных (СИП) 100 п. м.

Установка скамеек и урн


Установка скамеек 8 шт.
Установка урн 8 шт.

Озеленение (восстановление газона)

Рыхление почвы 222 м²
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 – 11,1 м³
Посев газонных трав вручную 222 м²
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 – 28,8 м³
Посев газонных трав вручную 144 м²

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

до проведения работ

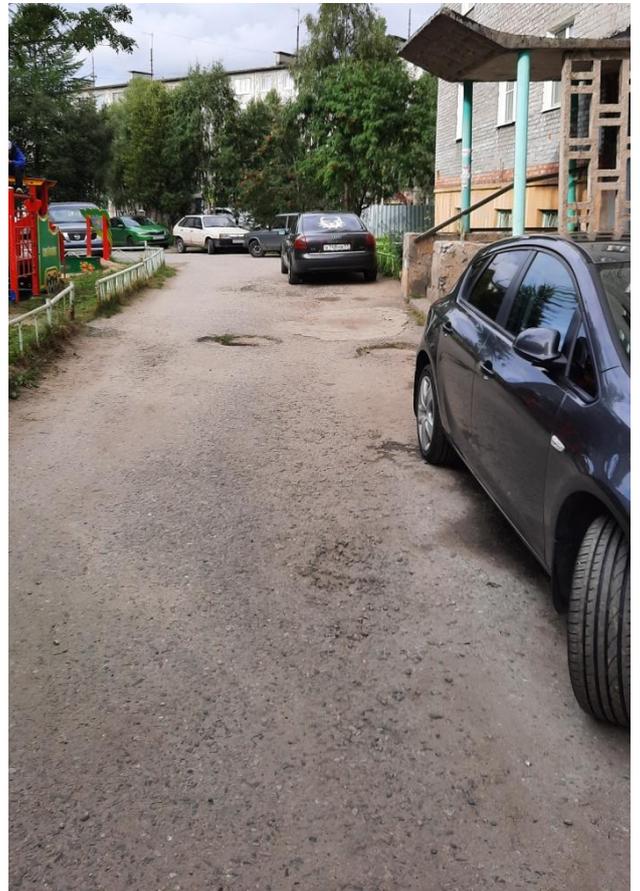

Выполнение работ по состоянию на 23.05.2024.




Выполнение работ по состоянию на 30.05.2024.



Выполнение работ по состоянию на 10.06.2024.






Выполнение работ по состоянию на 21.06.2024.

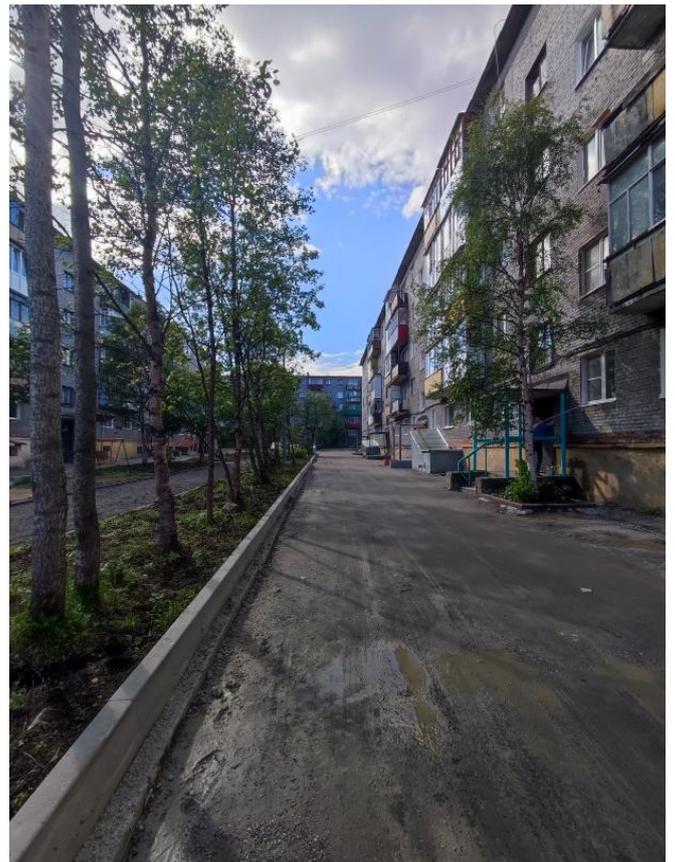

Выполнение работ по состоянию на 05.08.2024.



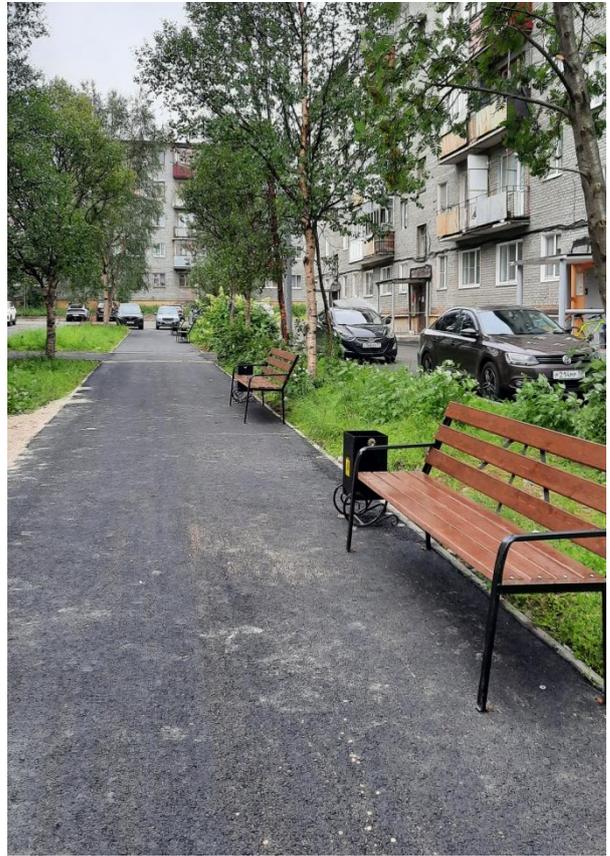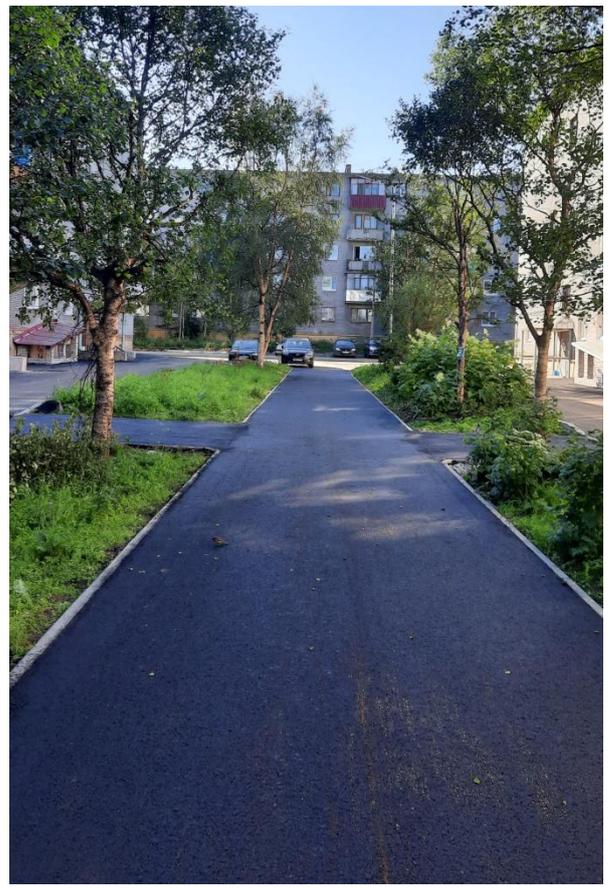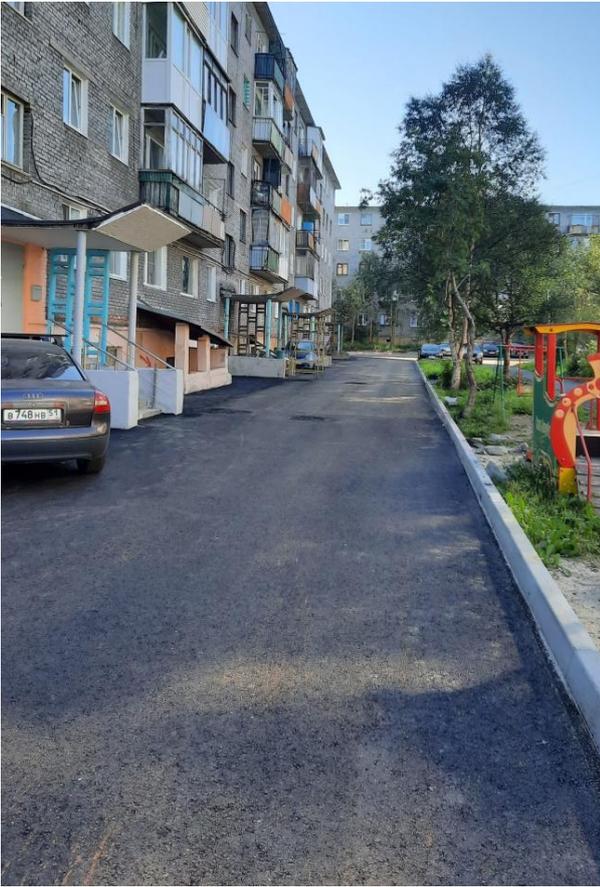

По состоянию на 16.08.2024 работы приняты в полном объеме.

